



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SECRETARÍA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

INFORME DE AVANCE
VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
(Modalidad Semi-presencial)
AL 30/04/2014

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos

Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores
			Entrega de Plantillas
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores
			Certificación de los Programas Académicos en Decanatos
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas
			Recepción de Plantillas
			Validación de plantillas vs recursos faltantes
Revisión inicial (preliminar)			
Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos
			Recepción
			Revisión/Ajustes
		Diseño de contenidos	Aplicar formato
			Tecnología de texto
			Solicitud imágenes DG
	Elaboración G.Audio		
	Producción MM	Elaboración G.Anim.	
		Entr. insumos Dpto.MM	
		Subir fuentes Google Drive	
		Revisión DI	
		Ajustes MM	
	Diseño de Actividades	Insumos	Conversion iSpring MM
			Subir Google Drive recursos convertidos
Estandarización		Plataforma	Montaje en el Aula
		Plataforma	Montaje en aula
Validar Curso	Plataforma	Solic. Consignas e Insumos (recursos)	
		Recepción de Consignas	
	Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado	
Liberar Curso	Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda	

ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

En el trimestre académico septiembre-diciembre 2012, se cumplió con la Fase I del proceso para la virtualización de las asignaturas del primer año de la Carrera de Organización Empresarial. Sin embargo, las asignaturas Inglés I, Inglés III y Fundamentos de Derecho no lograron culminar la Fase I.

Continuando con el cronograma, en enero 2013 se inicio la Fase II, la cual se planifico culminar en conjunto con la Fase III en el mes de julio 2013. Para el mes de julio sólo se alcanzo un 26,67% de la meta de virtualización de las asignaturas.

Aunque al cierre del mes de diciembre de 2013, se progreso en la virtualización, no se logro culminar otra asignatura. En el Cuadro N. 2 se plantea el seguimiento a las asignaturas rezagadas del primer año de la carrera, a partir de enero de 2014.

Cuadro 2: Plan de Acción fijado para el año 2014. Asignaturas del primer año

<i>Acción</i>	<i>Meta</i>	<i>Pendiente</i>	<i>Asignatura</i>	<i>Seguimiento al 30/04/2014</i>
Supervisión directa del Departamento Académico	28/02/2014	Fase I	Inglés I	Por debajo de lo esperado.
			Inglés II	No hubo avance
	30/03/2014	Fase II	Inglés III	No hubo avance
			Fundamentos de Derecho	Por debajo de lo esperado
			Introducción a la Computación	No hubo avance
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/01/2014	Guiones de Audio (*)	Hombre, Cultura y Sociedad II	En sincronización de recursos
			Fundamentos de Administración I	No hubo avance. El Especialista trabajará los guiones.
			Fundamentos de Economía	No hubo avance
Acompañamiento del Departamento Académico	28/02/2014	Estructuración del curso	Estadística I	Por debajo de lo esperado.
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/12/2013	Actividades por entregar	Fundamentos de Administración II	Pendiente
Incrementar ritmo de producción de recursos (**)	15/02/2014	Aumentar el porcentaje de avance	Matemática I	En proceso. 61,54% recursos listos
			Lenguaje II	En proceso. 69,57% recursos listos
			Matemática II	En proceso. 18,75% recursos listos

(*) Se ha detectado algún grado de dificultad para la elaboración de los guiones de audio por parte de los expertos en contenido. Se está evaluando la situación para encontrar alternativas.


(**) Relativo a los recursos tipo presentaciones transformados en HTML5 por la DSM.

Legenda:

I Trimestre
 II Trimestre
 III Trimestre

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 30/04/2014 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fase I y Fases II y III), la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial y el desarrollo del Bloque Introductorio.


Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 30/04/2014 – Fases I*, II y III.

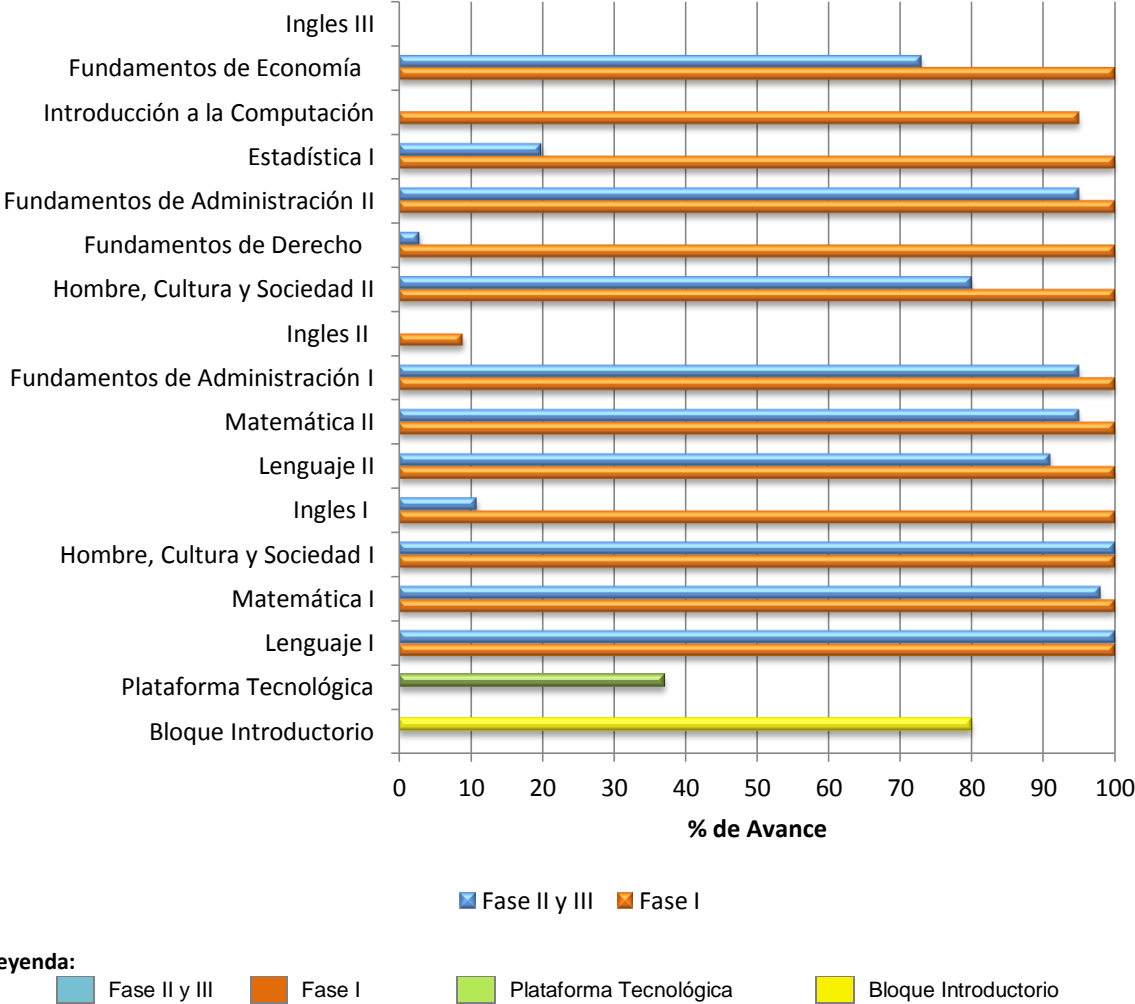

*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive

En el Gráfico 2 se representa la reestimación realizada por la DSM para cada asignatura del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial y su nivel de avance al 30/04/2014.

Gráfico 2: Meta reprogramada para Enero – Marzo 2014 (Fase II y III) evaluada al 30/04/2014

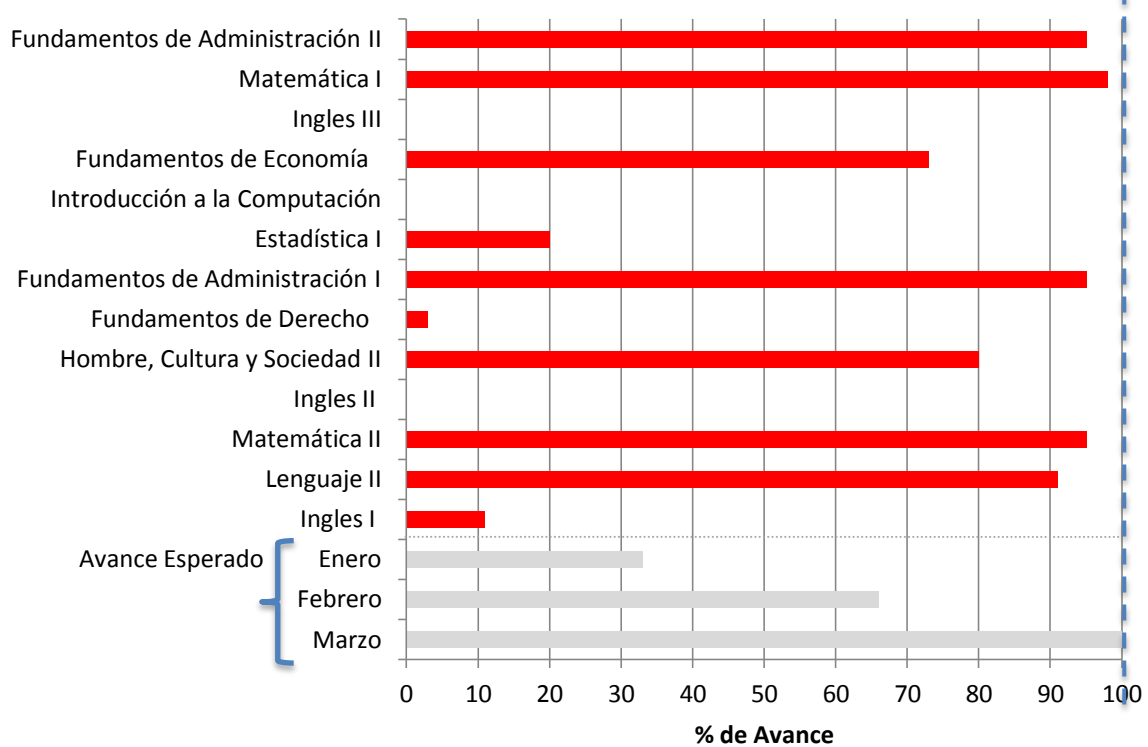

Legenda:
 Sobre lo esperado
 En lo esperado
 Muy por debajo de lo esperado
 Estimado

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

Estadística I: Se le solicitó al experto los contenidos faltantes. Se le enviaron ajustes correspondientes a los contenidos pertenecientes a la semana 1.

Fundamentos de Administración I: No hubo avance por parte del experto en contenido. Actualmente se están ajustando los guiones de audio.

Fundamentos de Administración II: Se mantiene igual.

Fundamentos de Derecho: Se comenzó a trabajar con el desarrollo de los contenidos temáticos. A medida que han sido entregados por la experta, se han ido ajustando y colocando en el aula virtual.

Fundamentos de Economía: No hubo avances.

Hombre, Cultura y Sociedad II: En proceso de sincronización de recursos. En la plataforma sólo falta el montaje de los temas convertidos en HTML al aula.

Inglés I: La experta en contenido se encuentra trabajando en el desarrollo de los contenidos temáticos. Se realizaron algunos cambios que ameritó que la experta hiciese una revisión a las plantillas entregadas en la fase I.

Inglés II: No hubo avance.

Inglés III: No hubo avance. El experto en contenido está trabajando con Inglés I.

Introducción a la Computación: No hubo avance. Se fijó el 25/04/2014 como fecha tope de entrega de los pendientes, pero no hubo avance por parte del experto en contenido.

Lenguaje II: Se avanzó en la configuración de actividades en el aula. Se espera que el experto en contenido complete el envío de las actividades faltantes, las consignas de los foros y la actividad diagnóstica.

Matemática I: El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio. Y diseño de una actividad formativa.

Matemática II: El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio. Y diseño de actividades formativas.


ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Para el mes de enero 2014 se procedió a designar los Especialistas que acompañaran a los expertos en contenido en el proceso de virtualización. Seguidamente, cada especialista inicio el trabajo de contactar a cada profesor para facilitarle los mecanismos de comunicación disponibles en este proceso de acompañamiento.

Luego del proceso de revisión del material disponible en las carpetas compartidas en el Google Drive cada Especialista envió las recomendaciones para poder culminar con la Fase I. Las Plantillas que debe llenar el experto en contenido deben presentar una ilación coherente entre las mismas, así como, entre las plantillas y recursos sugeridos lo cual permitirá el exitoso diseño del ambiente semipresencial en el espacio de la Plataforma Moodle que se está desarrollado. En el Gráfico N. 3 se muestra el nivel de avance de cada asignatura del segundo.

Gráfico 3: Avance General de la Virtualización del Segundo Año Org. Empresarial al 30/04/2014 – Fases I*, II y III.

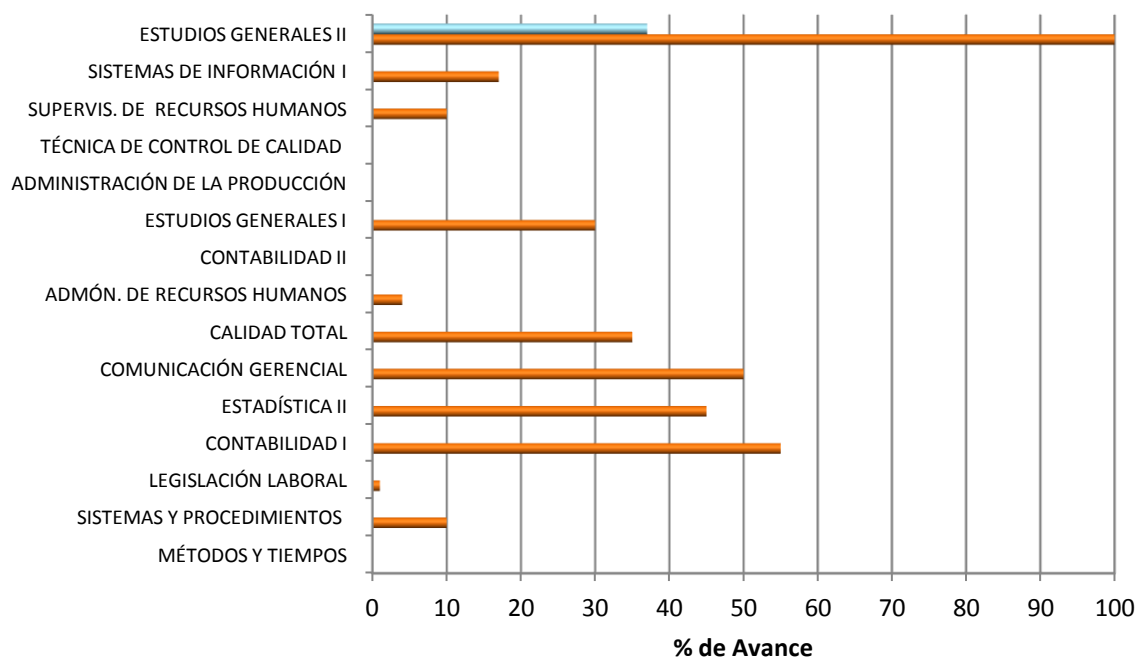


Leyenda:

■ Fase II y III ■ Fase I

*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive luego de la revisión del Especialista.

En el Gráfico 4 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

Gráfico 4: Seguimiento al Avance alcanzado al 30/04/2014 en comparación al esperado por la DSM en la Virtualización del Segundo Año de la Carrera de Organización Empresarial. Meta Abril 2014 (Fase I*)

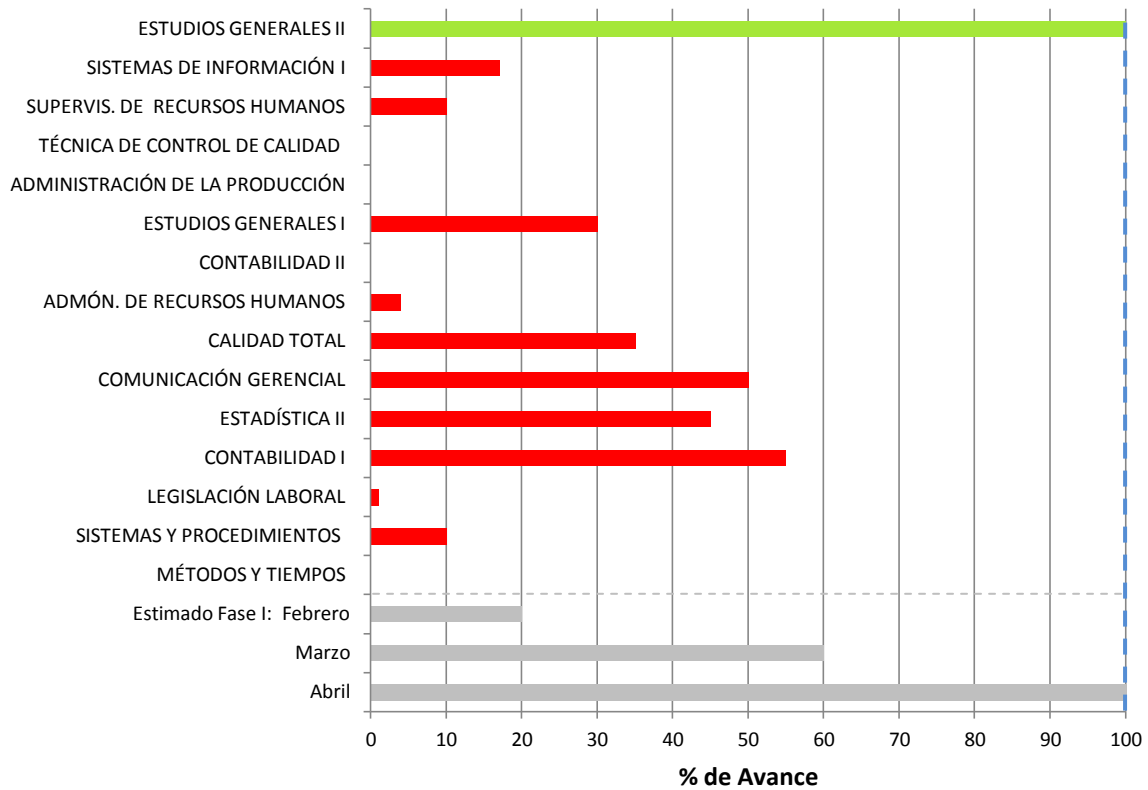

Leyenda:
■ Sobre lo esperado ■ En lo esperado ■ Por debajo de lo esperado ■ Estimado

* Para cumplir con el 100% de la Fase I el experto en contenido debe atender y responder a las recomendaciones dadas por el Especialista en cuanto a la relación entre las Plantillas y Recursos propuestos, conforme al Programa Académico certificado.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

Administración de la producción: No hubo avance. El experto en contenidos aún no ha respondido ninguno de los correos que se le ha enviado.

Administración de Recursos Humanos: No hubo avance. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

Calidad Total: Completado Estructura en el aula. Entregados los recursos asociados a la estructura. Actualmente el profesor está ajustando la cantidad de recursos para las sesiones No Presenciales (NP) y Presenciales (P). Inicialmente se presentaba 90% NP y 10% P.

Comunicación Gerencial: Se avanzó en la configuración del aula en la plataforma. El experto en contenido ajustó parcialmente la plantilla 3. Se le solicitó reajuste.

Contabilidad I: Se avanzó en la configuración del aula en la plataforma. El experto en contenido ajustó parcialmente las plantillas 3 y 6. Se le solicitó reajuste.

Contabilidad II: No hubo avances. El experto en contenido no ha enviado material para revisar. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

Estadística II: Se hizo la revisión del material enviado por el experto en contenido y se están haciendo ajustes a las plantillas 3 y 6.

Estudios Generales I: Completado Estructura en el aula.

Estudios Generales II: Se avanzó en la configuración del aula en la plataforma. Listos los recursos de las sesiones presenciales para enviarlos a producción. El experto en contenido está realizando ajustes en los recursos de las sesiones no presenciales.

Legislación Laboral: No hubo avance. No se ha asignado a un nuevo experto en contenido.

Métodos y tiempos: No hay ningún avance. No se ha comenzado con el llenado de las plantillas correspondiente a la fase I

Sistemas de Información I: Se avanzó en la configuración del aula en la plataforma. Se han acordado sucesivas fechas de entrega para las plantillas pero sin avance significativo por parte del experto en contenido.

Sistemas y procedimientos: El experto en contenido solo ha entregado algunas plantillas. Integración en el aula. No hubo avance.

Supervisión de Recursos Humanos: Solo se encuentran las plantillas completadas. No hubo avance.


Técnica de Control de Calidad: No hubo avance.

ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de mayo 2013 inicio el proceso para la virtualización de las asignaturas del tercer año de la carrera de Organización Empresarial (6 cursos regulares, 4 Electivas Profesionales y 1 Pasantía), dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por éstos.

En el Gráfico 5 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables al 30/04/2014. No hubo avances en el mes de abril.

Gráfico 5: Plantillas*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Tercer año de Org. Emp. al 30/04/2014 (Fase I)**

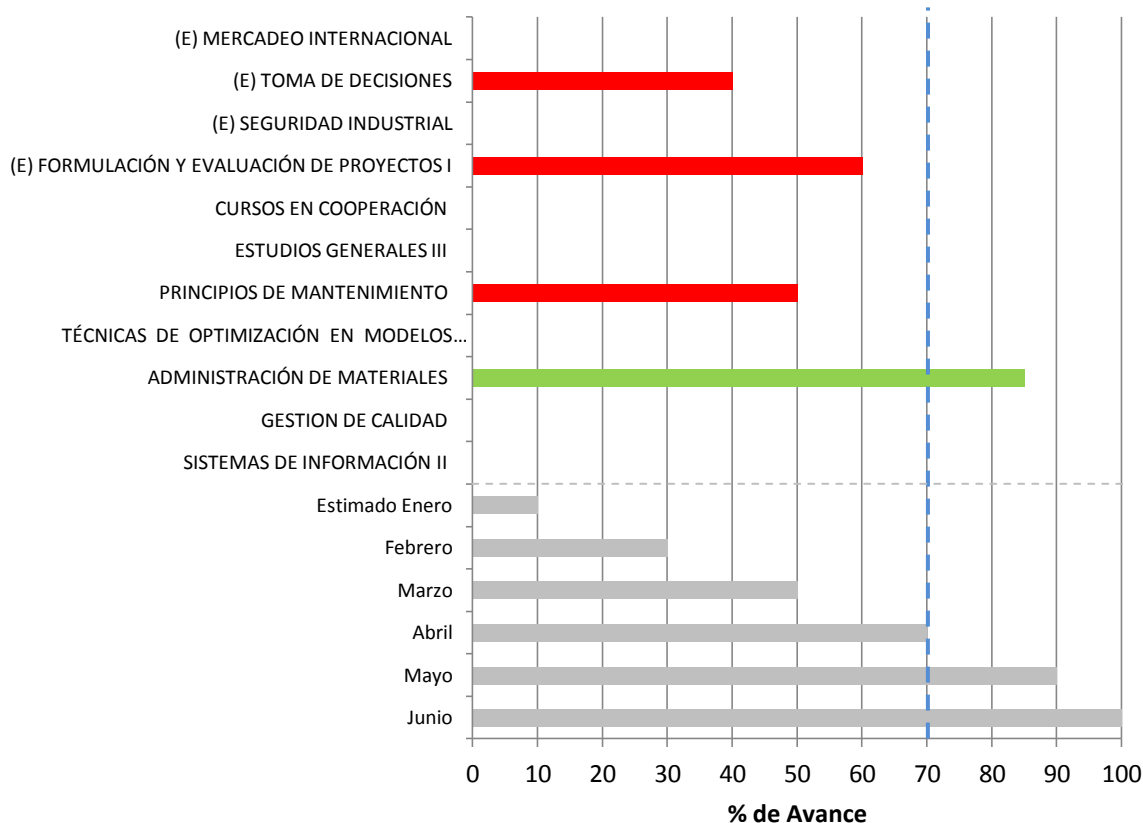

Leyenda:

■ Sobre lo esperado
 ■ En lo esperado
 ■ Por debajo de lo esperado
 ■ Estimado

(*)

Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO

Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO

Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO

Plantilla N° 7 GLOSARIO

Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA

Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

Plantilla N° 10 EVALUACIÓN

**El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive
