



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**

SECRETARÍA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

**INFORME DE AVANCE**  
**VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS**  
**DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**  
**(Modalidad Semi-presencial)**  
**AL 31/05/2014**

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

**Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos**

Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores
			Entrega de Plantillas
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores
			Certificación de los Programas Académicos en Decanatos
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas
			Recepción de Plantillas
			Validación de plantillas vs recursos faltantes
Revisión inicial (preliminar)			
Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos
			Recepción
			Revisión/Ajustes
		Diseño de contenidos	Aplicar formato
			Tecnología de texto
			Solicitud imágenes DG
	Elaboración G.Audio		
	Producción MM	Elaboración G.Anim.	
		Entr. insumos Dpto.MM	
		Subir fuentes Google Drive	
		Revisión DI	
		Ajustes MM	
	Diseño de Actividades	Plataforma	Conversion iSpring MM
			Subir Google Drive recursos convertidos
Plataforma		Montaje en el Aula	
Insumos		Solic. Consignas e Insumos (recursos)	
		Recepción de Consignas	
Estandarización		Aplicar formato	
		Tecnología de texto	
Validar Curso	Plataforma	Montaje en aula	
		Revisión/Ajustes	
	Revisión final	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica	
Fase III	Liberar Curso	Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado
		Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda

## ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

Para septiembre de 2012 se dio inicio a la virtualización de las quince asignaturas del primer año de la carrera. En diciembre de 2013 se fijó unas estrategias para atender las asignaturas rezagadas del primer año, conforme a las dificultades que se habían presentado en el transcurso del año. En el Cuadro N. 2 se muestra que el resultado al 31/05/2014 aun no resulta favorable.

**Cuadro 2: Plan de Acción fijado para el año 2014. Asignaturas del primer año**

<i>Acción</i>	<i>Meta</i>	<i>Pendiente</i>	<i>Asignatura</i>	<i>Seguimiento al 31/05/2014</i>
Supervisión directa del Departamento Académico	28/02/2014 30/03/2014	Fase I	Inglés I	Por debajo de lo esperado.
			Inglés II	Por debajo de lo esperado. Expertas en contenido avanzaron en reestructuración del programa
		Fase II	Inglés III	No hubo avance
		Fundamentos de Derecho	Por debajo de lo esperado	
		Introducción a la Computación	Por debajo de lo esperado	
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/01/2014	Guiones de Audio	Hombre, Cultura y Sociedad II	Sólo falta culminar los recursos HTML5
			Fundamentos de Administración I	El Especialista trabajó los guiones de audio presentados por el experto en contenido.
			Fundamentos de Economía	Pendiente seguimiento.
Acompañamiento del Departamento Académico	28/02/2014	Estructuración del curso	Estadística I	Por debajo de lo esperado.
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/12/2013	Actividades por entregar	Fundamentos de Administración II	Pendiente seguimiento.
Incrementar ritmo de producción de recursos (**)	15/02/2014	Aumentar el porcentaje de avance	Matemática I	En proceso. 92,31% recursos listos
			Lenguaje II	En proceso. 69,57% recursos listos
			Matemática II	En proceso. 43,75% recursos listos


(\*\*)Relativo a los recursos tipo presentaciones transformados en HTML5 por la DSM.

Leyenda:

I Trimestre
  II Trimestre
  III Trimestre

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 30/04/2014 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fase I y Fases II y III), la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial y el desarrollo del Bloque Introductorio.

**Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 31/05/2014 – Fases I\*, II y III.**

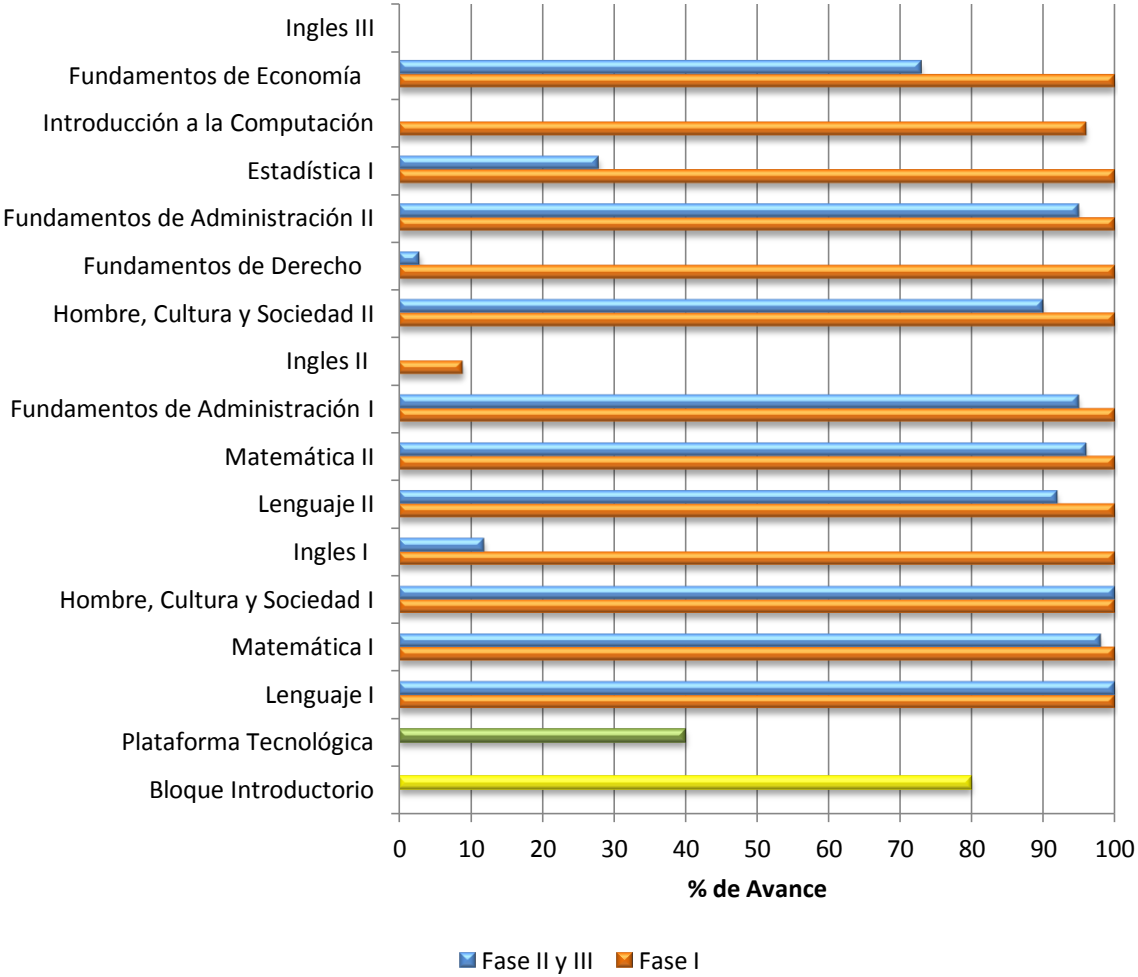


**Leyenda:**  
■ Fase II y III    ■ Fase I    ■ Plataforma Tecnológica    ■ Bloque Introductorio

\*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive, ajustado a los requerimientos de los Especialistas

En el Gráfico 2 se representa la reestimación realizada por la DSM para cada asignatura del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial y su nivel de avance al 31/05/2014.

**Gráfico 2: Meta reprogramada para Enero – Marzo 2014 (Fase II y III) evaluada al 31/05/2014**

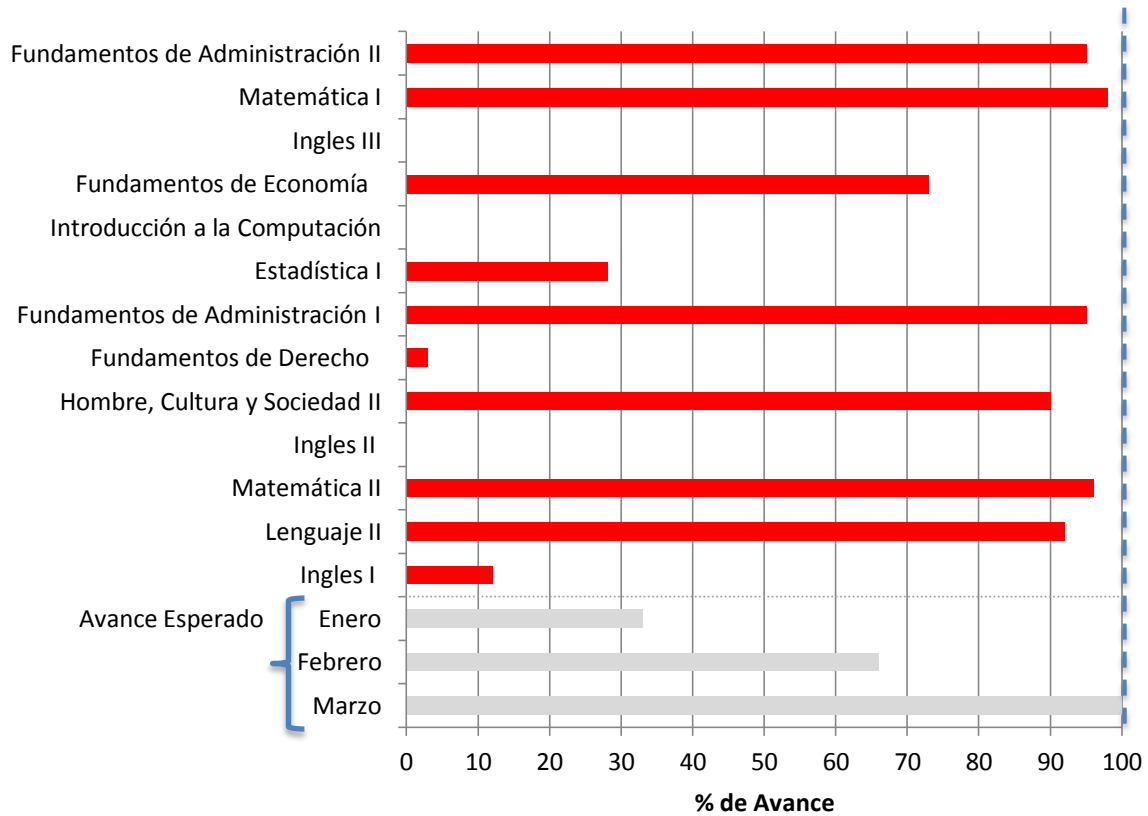

**Leyenda:**  
 Sobre lo esperado    
 En lo esperado    
 Muy por debajo de lo esperado    
 Estimado

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

*Estadística I:* Se enviaron nuevos ajustes al experto en contenidos.

*Fundamentos de Administración I:* El Especialista ajusto los guiones de audio.

*Fundamentos de Administración II:* Se mantiene igual. Experta en contenido solicito información sobre cuáles requerimientos están faltando para culminar la virtualización de la asignatura.

*Fundamentos de Derecho:* Se enviaron correos a la experta en contenido sin recibir respuesta.

*Fundamentos de Economía:* No hubo avance.

*Hombre, Cultura y Sociedad II:* Resta únicamente el montaje de los recursos convertidos en HTML5 al aula.

*Inglés I:* La experta en contenido se encuentra trabajando en el desarrollo de los contenidos temáticos.

*Inglés II:* Las expertas en contenido trabajaron en la reestructuración del programa de la asignatura.

*Inglés III:* No hubo avance. El experto en contenido está trabajando con Inglés I.

*Introducción a la Computación:* Se recibió solo uno de los insumos pendientes. Se acordó un plan de entregas semanal del 02 al 23 de junio.

*Lenguaje II:* No hubo avance por parte del Experto en contenidos. Se espera que complete el envío de las actividades faltantes, las consignas de los foros y la actividad diagnóstica. Se avanzó en la producción multimedia.

*Matemática I:* El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio. Y diseño de una actividad formativa.

*Matemática II:* El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio. Y diseño de actividades formativas.


## ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Para el mes de enero 2014 se procedió a designar los Especialistas que acompañaran a los expertos en contenido en el proceso de virtualización. Seguidamente, cada especialista inicio el trabajo de contactar a cada profesor para facilitarle los mecanismos de comunicación disponibles en este proceso de acompañamiento.

Luego del proceso de revisión del material disponible en las carpetas compartidas en el Google Drive cada Especialista envió las recomendaciones para poder culminar con la Fase I. Las Plantillas que debe llenar el experto en contenido deben presentar una ilación coherente entre las mismas, así como, entre las plantillas y recursos sugeridos lo cual permitirá el exitoso diseño del ambiente semipresencial en el espacio de la Plataforma Moodle que se está desarrollado. En el Gráfico N. 3 se muestra el nivel de avance de cada asignatura del segundo.

**Gráfico 3: Avance General de la Virtualización del Segundo Año Org. Empresarial al 31/05/2014 – Fases I\*, II y III.**

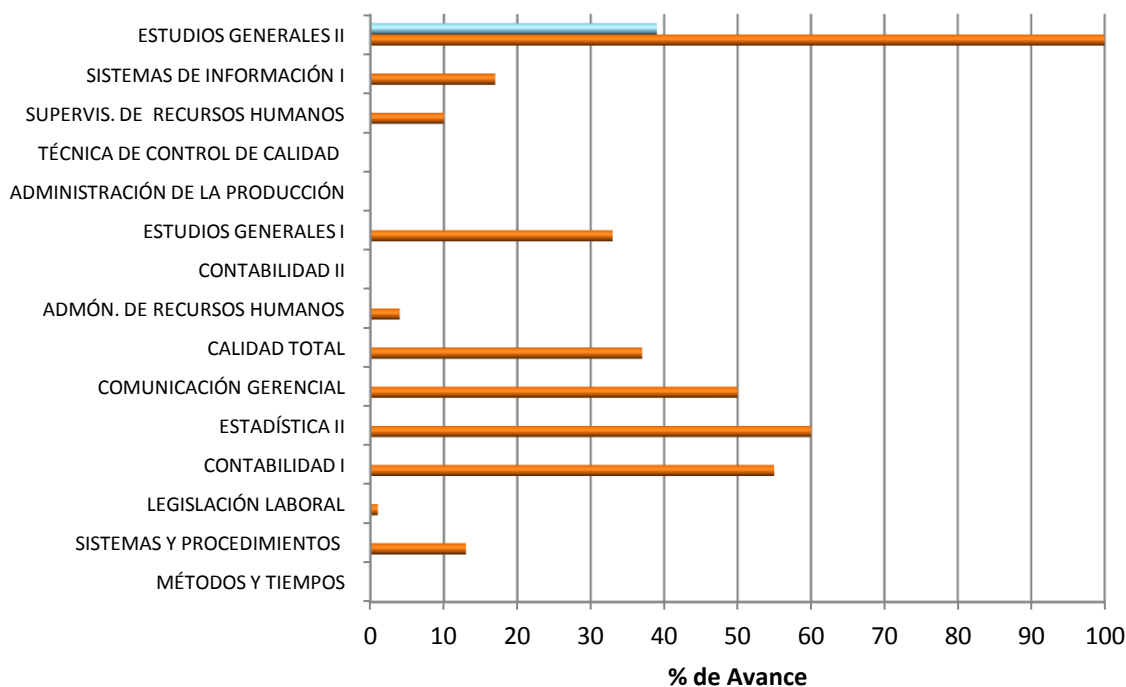


**Leyenda:**

■ Fase II y III    ■ Fase I

\*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive luego de la revisión del Especialista.

En el Gráfico 4 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

**Gráfico 4: Seguimiento al Avance alcanzado al 31/05/2014 en comparación al esperado por la DSM en la Virtualización del Segundo Año de la Carrera de Organización Empresarial. Meta Abril 2014 (Fase I\*)**

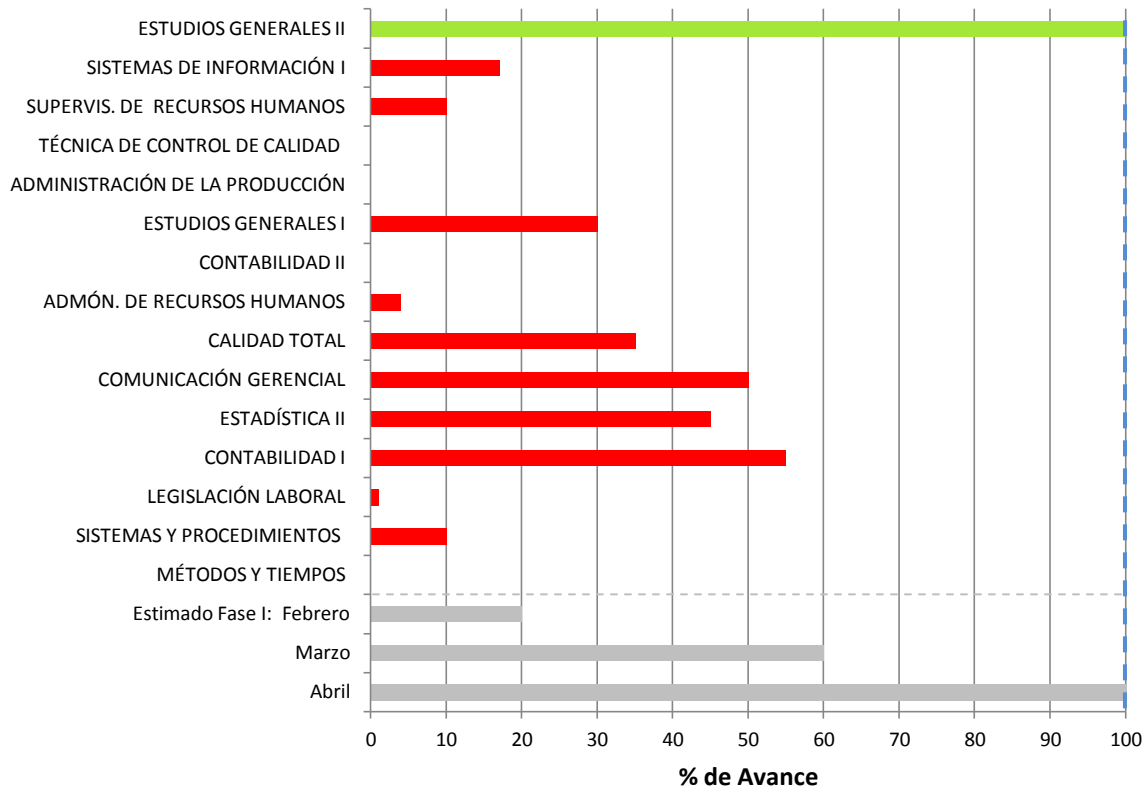

**Leyenda:**

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

\* Para cumplir con el 100% de la Fase I el experto en contenido debe atender y responder a las recomendaciones dadas por el Especialista en cuanto a la relación entre las Plantillas y Recursos propuestos, conforme al Programa Académico certificado.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

*Administración de la producción:* No hubo avance. El experto en contenidos no ha enviado material para revisar.

*Administración de Recursos Humanos:* No hubo avance. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.



*Calidad Total:* Se está trabajando en el ajuste de la estructura del aula. Está pendiente que el profesor ajuste la cantidad de recursos para las sesiones No Presenciales (NP) y Presenciales (P).

*Comunicación Gerencial:* No hubo avance. Desde el 18/04 no fue posible contactar al experto en contenido por correo o por teléfono, hasta el 27/05, cuando se estableció contacto telefónico con el profesor. Manifestó estar limitado de tiempo debido a problemas de salud, familiares y personales y solicitó apoyo. El caso fue elevado al Departamento Académico.

*Contabilidad I:* Completada la configuración del aula en la plataforma. El experto en contenido reajustó la plantilla 3; sin embargo, es necesario seguir refinándola. Se acordó una reunión para revisión y plan de trabajo.

*Contabilidad II:* No hubo avances. El experto en contenido no ha enviado material para revisar.

*Estadística II:* Se hizo la revisión del material enviado por el experto en contenido y se están haciendo ajustes a las plantillas 3 y 6.

*Estudios Generales I:* Actualmente se está trabajando en el diseño de los recursos entregados.

*Estudios Generales II:* Completada la configuración del aula en la plataforma. Recibidos los ajustes de algunos recursos.

*Legislación Laboral:* No hubo avance. El Departamento Académico designó al nuevo experto en contenido.

*Métodos y tiempos:* No hay ningún avance. No se ha comenzado con el llenado de las plantillas correspondiente a la fase I. Se han enviado varios correos a la experta en contenido sin recibir respuesta de su parte.

*Sistemas de Información I:* No hubo avance. La profesora informó sobre su situación familiar y personal, que ha afectado su participación y respuesta en la virtualización. Se propuso un plan de entregas para completar la Fase I (Plantillas), basado en la estimación de tiempo de las tareas inherentes. Aún sin respuesta.

*Sistemas y procedimientos:* El experto en contenido solo ha entregado algunas plantillas. Se adelanto trabajo en la integración en el aula.

*Supervisión de Recursos Humanos:* No hubo avance.


*Técnica de Control de Calidad:* No hubo avance.

## ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de mayo 2013 inicio el proceso para la virtualización de las asignaturas del tercer año de la carrera de Organización Empresarial (6 cursos regulares, 4 Electivas Profesionales y 1 Pasantía), dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por éstos.

En el Gráfico 5 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables al 31/05/2014. No hubo avances en el mes de abril.

**Gráfico 5: Plantillas\*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Tercer año de Org. Emp. al 31/05/2014 (Fase I\*\*)**

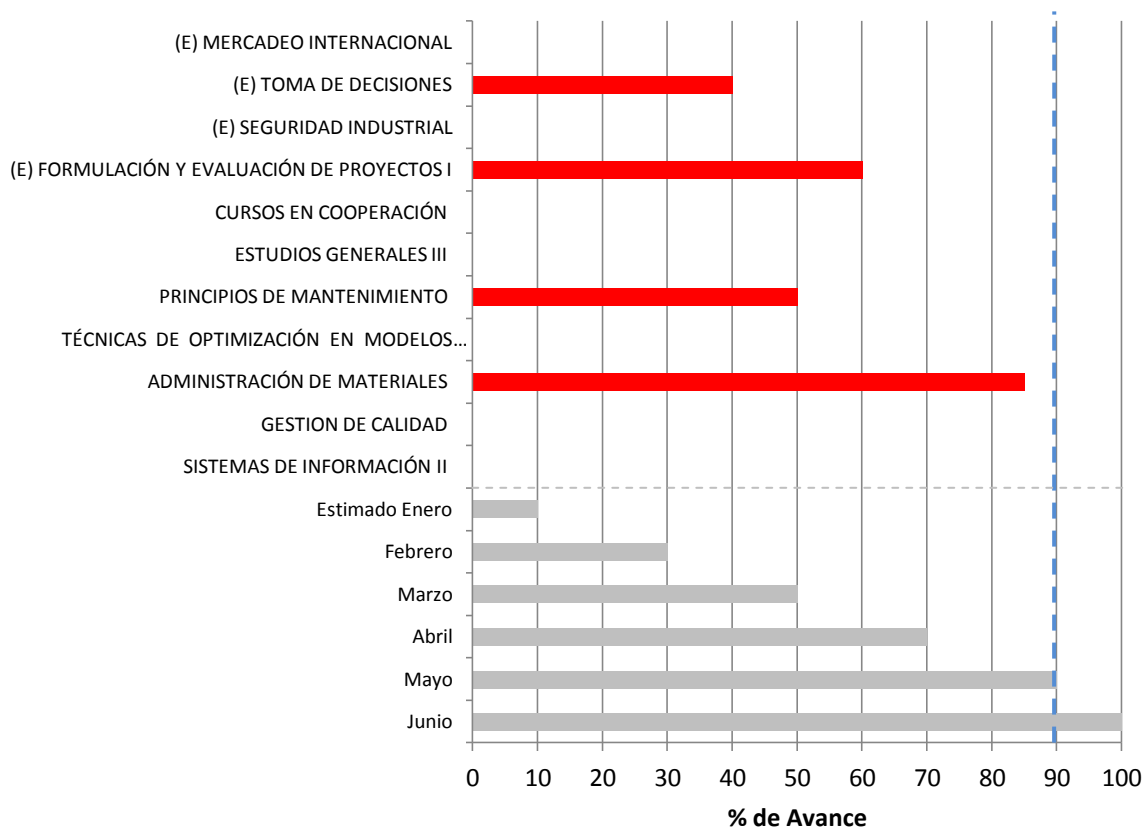

### Leyenda:

■ Sobre lo esperado     
 ■ En lo esperado     
 ■ Por debajo de lo esperado     
 ■ Estimado

(\*)

Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO

Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO

Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO

Plantilla N° 7 GLOSARIO

Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA

Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

Plantilla N° 10 EVALUACIÓN

\*\*El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive
