



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
SECRETARÍA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

**INFORME DE AVANCE**  
**VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS**  
**DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**  
**AL 30/04/2013**

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

**Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos**

Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores Entrega de Plantillas			
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores Certificación de los Programas Académicos en Decanatos			
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas			
			Recepción de Plantillas			
			Validación de plantillas vs recursos faltantes			
			Revisión inicial (preliminar)			
		Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos Recepción Revisión/Ajustes	
Diseño de contenidos	Aplicar formato Tecnología de texto Solicitud imágenes DG Elaboración G.Audio Elaboración G.Anim.					
	Producción MM			Entr. insumos Dpto.MM Subir fuentes Google Drive Revisión DI Ajustes MM Conversión iSpring MM Subir Google Drive recursos convertidos		
				Plataforma	Montaje en el Aula	
				Diseño de Actividades	Insumos	Solic. Consignas e Insumos (recursos) Recepción de Consignas
					Estandarización	Aplicar formato Tecnología de texto
Plataforma	Montaje en aula Revisión/Ajustes					
Fase III	Validar Curso		Plataforma	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica		
			Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado		
	Liberar Curso		Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda		


### **ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO**

En el trimestre académico septiembre-diciembre 2012, se cumplió con la Fase I del proceso para la virtualización de las asignaturas del primer año de la Carrera de Organización Empresarial. Sin embargo, las asignaturas Inglés I, Inglés III y Fundamentos de Derecho no lograron culminar la Fase I.

Continuando con el cronograma, en enero 2013 se inicio la Fase II, la cual se culminará en conjunto con la Fase III en el mes de julio 2013.

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 30/04/2013 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fases II y III), y la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial.


**Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 30/04/2013**

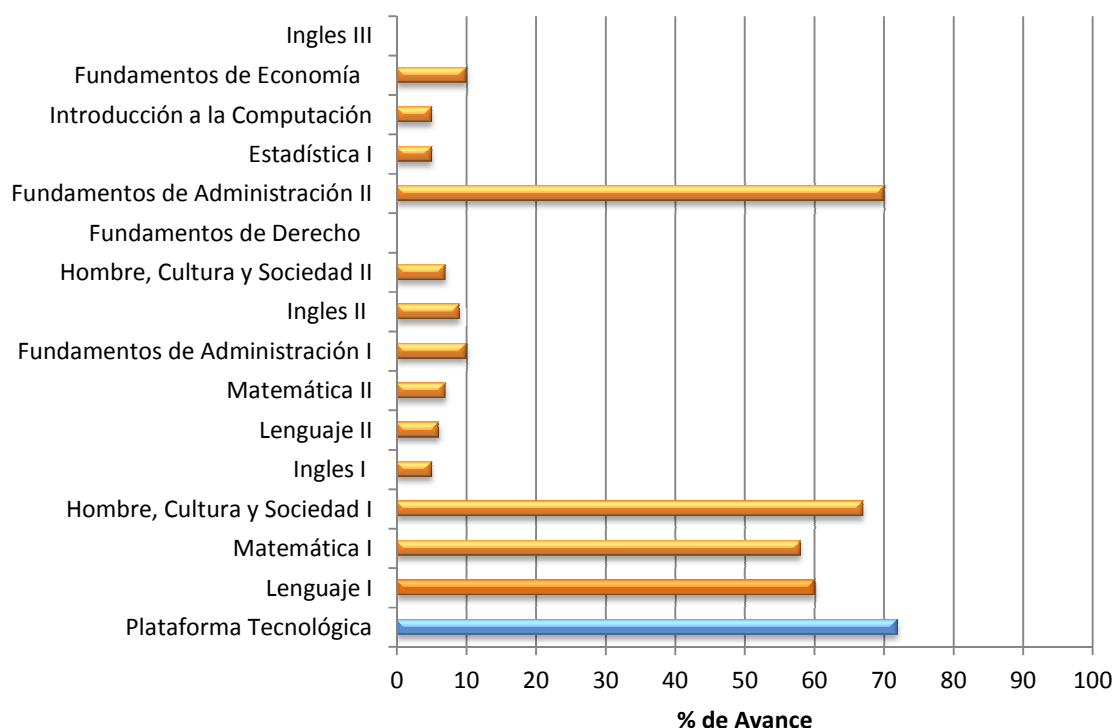


En los Gráficos 2 y 3 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

**Seguimiento al Avance alcanzado al 30/04/2013 en comparación al Esperado por la DSM en la Virtualización del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial**


**Gráfico 2: Meta para Marzo 2013**

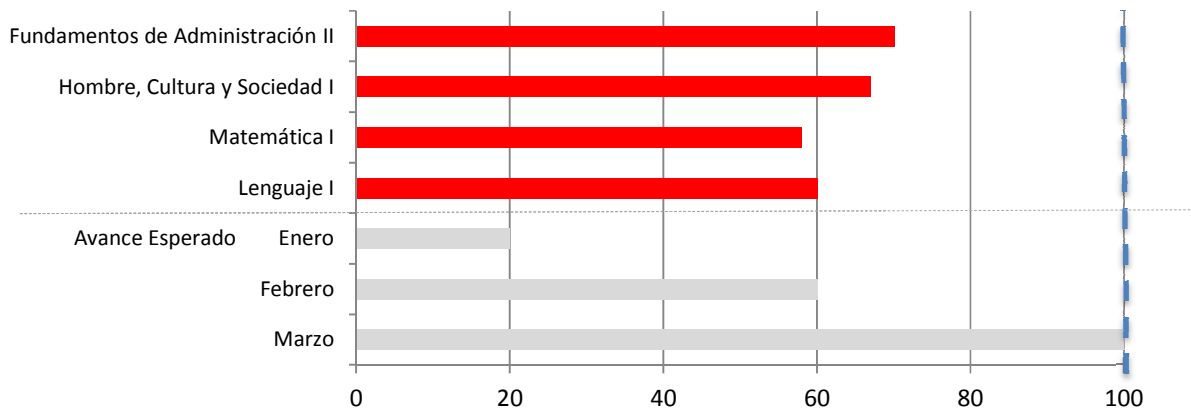

**Legenda:**



**Gráfico 3: Meta para Julio 2013**

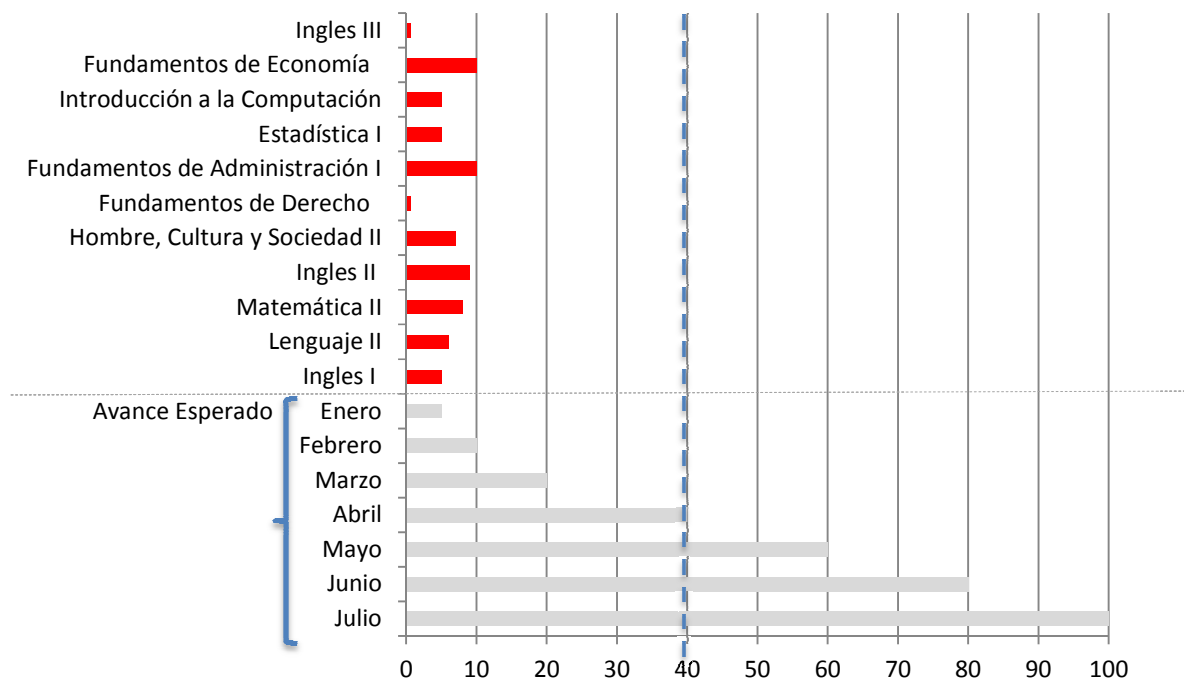

**Legenda:**



En este sentido, en el Gráfico N. 2 se muestra el avance de los cursos de Lenguaje I, Matemática I, Hombre, Cultura y Sociedad I y Fundamentos de Administración II. El porcentaje que se refleja representa el avance en el diseño de contenidos y producción multimedia, así como el diseño de los recursos asociados con las actividades en el aula virtual.

*Lenguaje I:* Este porcentaje ha sido recalculado sobre la base del cambio del programa de la asignatura que fuera entregado el 05 de abril por la instancia Académica responsable.

De acuerdo con la revisión realizada en conjunto con el experto en contenido (profesor), hay que rehacer aproximadamente un 40% del curso (reestructuración del curso, planificación de actividades y la consiguiente generación y modificación de recursos).

La mayoría de los recursos que ya estaban desarrollados serán utilizados; sin embargo algunos requieren modificaciones que involucran ajustes a nivel de producción audiovisual. Otros recursos han sido descartados.

*Hombre, Cultura y Sociedad I:* El porcentaje refleja el avance de estandarización de objetivos instruccionales para cada tema y unidad del programa y montaje de recursos entregados (presentación con audio, lecturas, etc.) en el aula virtual.

*Matemática I:* El experto en contenidos entregó insumos el día 30 de abril (no completos) solo la introducción y resumen de cada uno de las clases presenciales y no presenciales. Se avanzó en el diseño del aula virtual.

*Fundamentos de Administración II:* El porcentaje refleja el avance de estandarización y montaje de recursos entregados (presentación con audio, lecturas, etc.) en el aula virtual.

Con respecto a lo estimado no se ha alcanzado el nivel esperado en el cuarto mes de trabajo, de este semestre. Durante dos semanas (aprox.) del mes de abril, el equipo instruccional se dedicó a la elaboración del Modelo Instruccional de la carrera Organización Empresarial.

Por otra parte, en el Gráfico N. 3 se observa que no hubo avance en el desarrollo de las once asignaturas restantes. Para el cierre del mes de abril no se habían recibido los Programas Académicos ajustados para las asignaturas de Inglés I, Inglés III e Introducción a la Computación.


## ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Acorde a las actividades ejecutadas hasta el 30/04/2013, la Fase I no ha podido ser concluida. Las nueve (9) asignaturas que no presentan avance son Supervisión de Recursos Humanos, Técnicas de Control de Calidad, Contabilidad II, Administración de Recursos Humanos, Comunicación Gerencial, Contabilidad I, Legislación Laboral, Sistemas y Procedimientos, y Métodos y Tiempo.

En el Gráfico N. 4 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7 y 9), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables.

**Gráfico 4: Plantillas\*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del segundo año de Org. Emp. al 30/04/2013 (Fase I)**

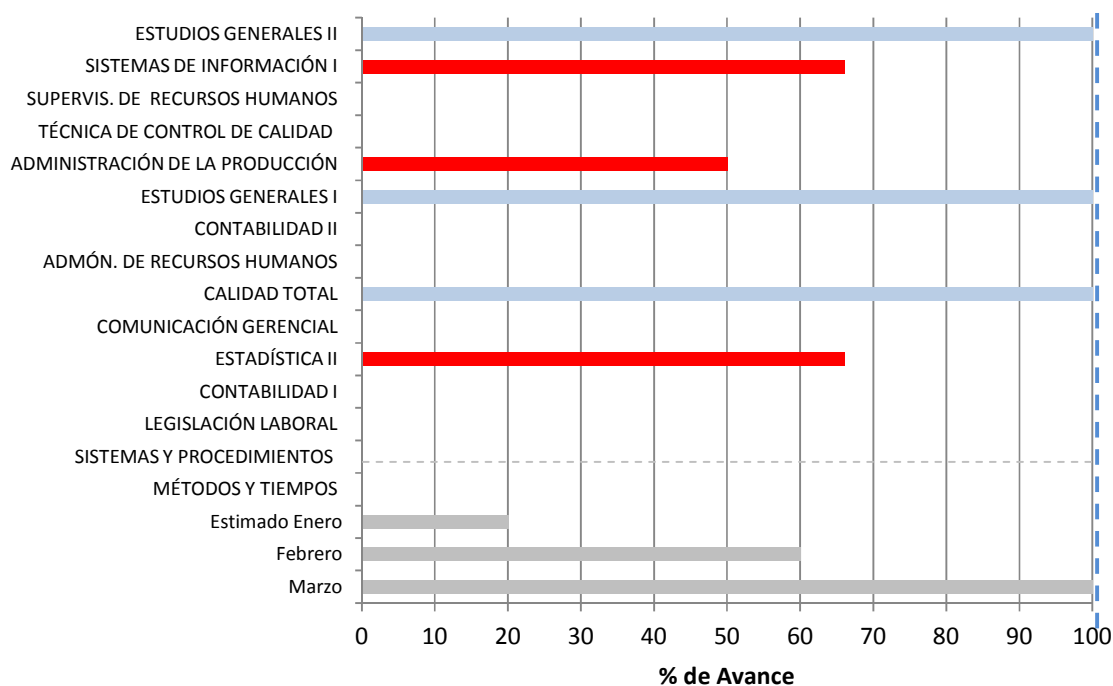

### Leyenda:

■ Sobre lo esperado     
 ■ En lo esperado     
 ■ Por debajo de lo esperado     
 ■ Estimado

(\*)

- Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
- Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO
- Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO
- Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO
- Plantilla N° 7 GLOSARIO
- Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA
- Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

### **ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO**

Se ha planificado convocar a los profesores responsables de virtualizar las asignaturas del tercer año para el trimestre académico abril-julio 2013, en las fechas 30/04/2013 y 02/05/2013.
