



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SECRETARÍA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

INFORME DE AVANCE
VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
AL 31/03/2013

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos

Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores Entrega de Plantillas		
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores Certificación de los Programas Académicos en Decanatos		
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas		
			Recepción de Plantillas		
			Validación de plantillas vs recursos faltantes		
			Revisión inicial (preliminar)		
		Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos Recepción Revisión/Ajustes
Diseño de contenidos	Aplicar formato Tecnología de texto Solicitud imágenes DG Elaboración G.Audio Elaboración G.Anim.				
	Producción MM			Entr. insumos Dpto.MM Subir fuentes Google Drive Revisión DI Ajustes MM Conversión iSpring MM Subir Google Drive recursos convertidos	
				Plataforma	Montaje en el Aula
				Diseño de Actividades	Insumos
Estandarización	Aplicar formato Tecnología de texto				
Plataforma	Montaje en aula Revisión/Ajustes				
Fase III	Validar Curso		Plataforma	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica	
			Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado	
	Liberar Curso		Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda	


ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

En el trimestre académico septiembre-diciembre 2012, se cumplió con la Fase I del proceso para la virtualización de las asignaturas del primer año de la Carrera de Organización Empresarial. Sin embargo, las asignaturas Inglés I, Inglés III y Fundamentos de Derecho no lograron culminar la Fase I.

Continuando con el cronograma, en enero 2013 se inicio la Fase II, la cual se culminará en conjunto con la Fase III en el mes de julio 2013.

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 31/03/2013 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fases II y III), y la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial.


Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 31/03/2013

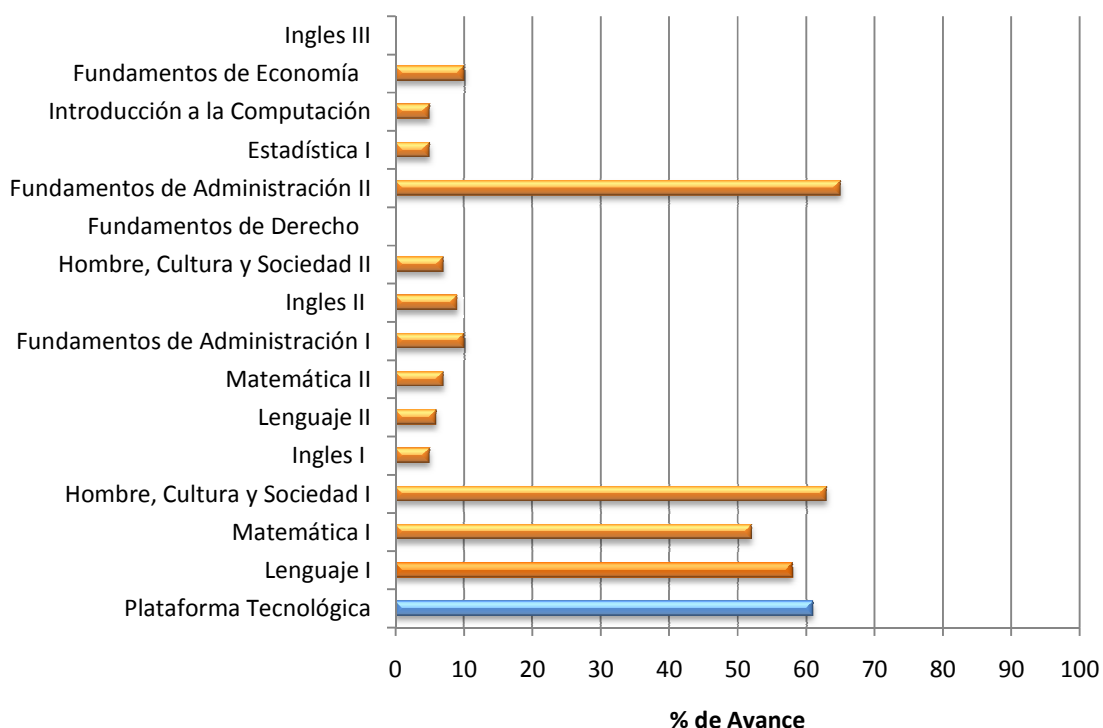

En los Gráficos 2 y 3 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

Seguimiento al Avance alcanzado al 31/03/2013 en comparación al Esperado por la DSM en la Virtualización del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial


Gráfico 2: Meta para Marzo 2013

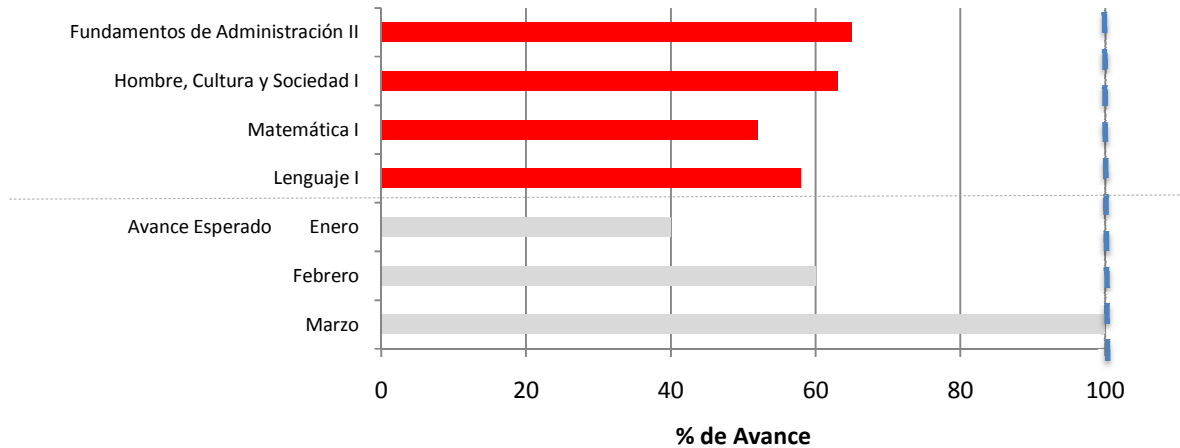

Leyenda:

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

Gráfico 3: Meta para Julio 2013

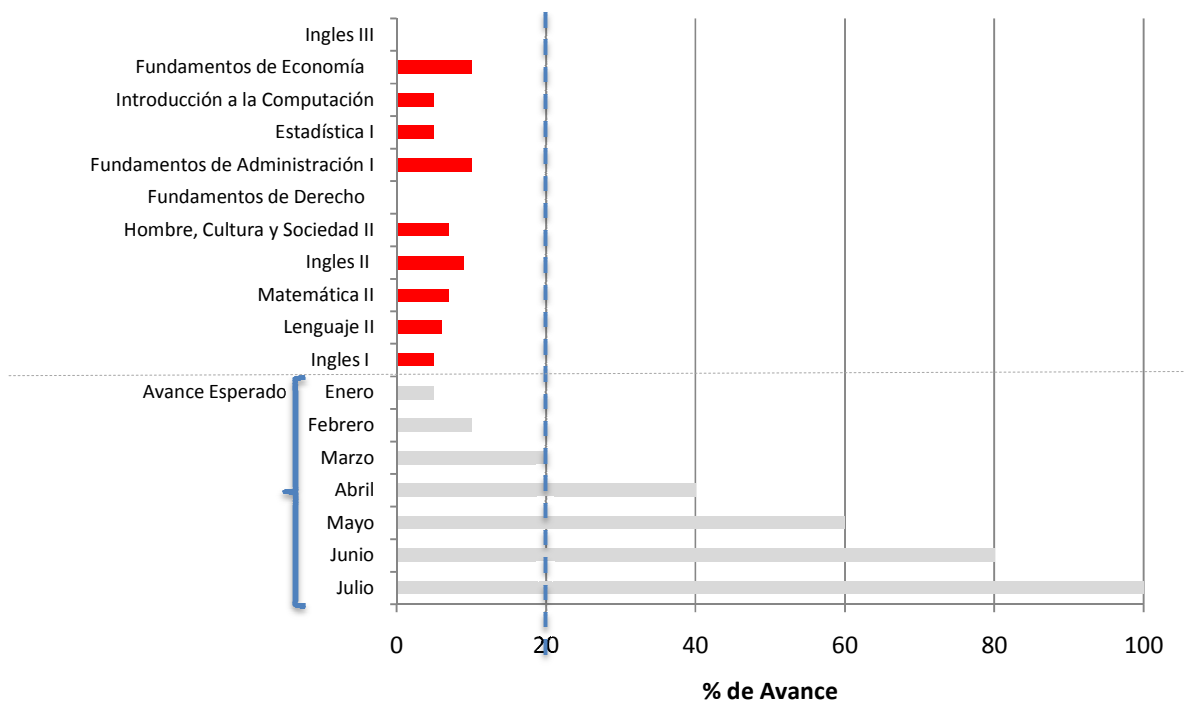

Leyenda:

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

En este sentido, en el Gráfico N. 2 se muestra el avance de los cursos de Lenguaje I, Matemática I, Hombre, Cultura y Sociedad I y Fundamentos de Administración II. El porcentaje que se refleja representa el avance en el diseño de contenidos y producción multimedia, así como el diseño de los recursos asociados con las actividades en el aula virtual.

Con respecto a lo estimado no se ha alcanzado el nivel esperado en el tercer mes de trabajo, de este semestre. Así mismo, debido al duelo Nacional, se acordó ajustar la fecha de entrega de las primeras cuatro asignaturas para el 18/04/2013.


Por otra parte, en el Gráfico N. 3 se observa que no hubo avance en el desarrollo de las once asignaturas restantes. Para el cierre del mes de marzo no se habían recibido los Programas Académicos ajustados para las asignaturas de Inglés I, Inglés III, Lenguaje I, Lenguaje II e Introducción a la Computación.

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Acorde a las actividades ejecutadas hasta el 31/03/2013, la Fase I se encuentra en pleno desarrollo. En el Gráfico N. 4 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7 y 9), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables.

Gráfico 4: Plantillas*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del segundo año de Org. Emp. al 31/03/2013 (Fase I)

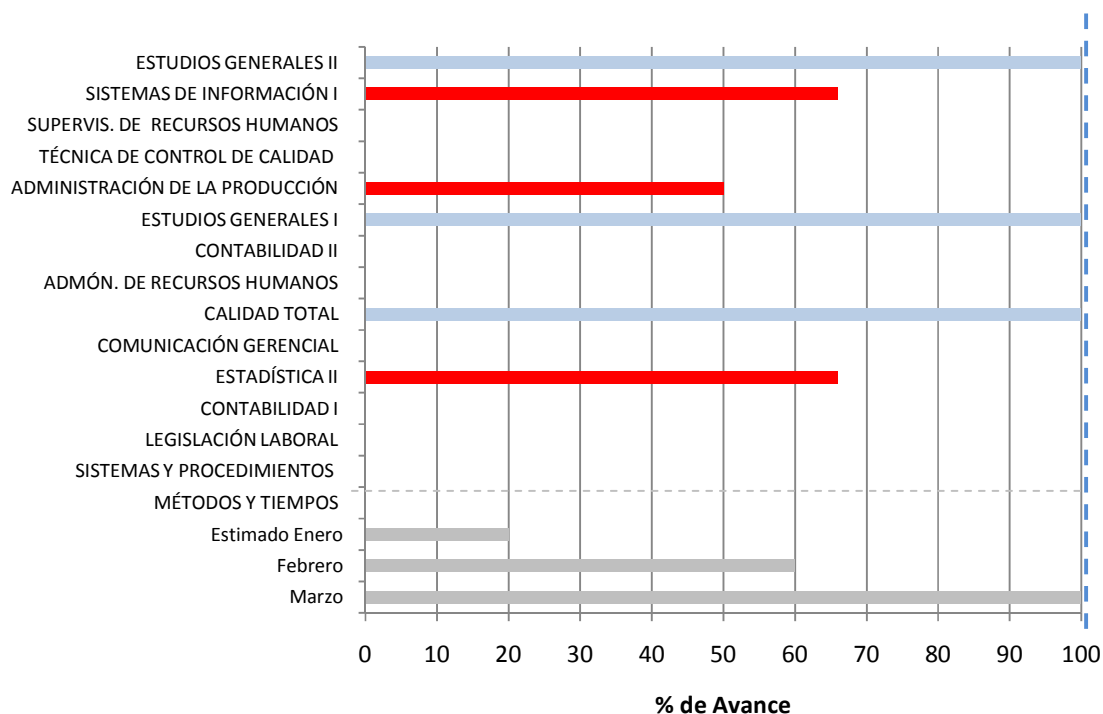

Legenda:

■ Sobre lo esperado
 ■ En lo esperado
 ■ Por debajo de lo esperado
 ■ Estimado

(*)

- Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
- Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO
- Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO
- Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO
- Plantilla N° 7 GLOSARIO
- Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA
- Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Se ha planificado convocar a los profesores responsables de virtualizar las asignaturas del tercer año para el trimestre académico abril-julio 2013.
