



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SECRETARÍA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

INFORME DE AVANCE
VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
(Modalidad Semi-presencial)
AL 31/01/2014

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos

Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores
			Entrega de Plantillas
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores
			Certificación de los Programas Académicos en Decanatos
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas
			Recepción de Plantillas
			Validación de plantillas vs recursos faltantes
Revisión inicial (preliminar)			
Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos
			Recepción
			Revisión/Ajustes
		Diseño de contenidos	Aplicar formato
			Tecnología de texto
			Solicitud imágenes DG
	Elaboración G.Audio		
	Producción MM	Elaboración G.Anim.	
		Entr. insumos Dpto.MM	
		Subir fuentes Google Drive	
		Revisión DI	
	Diseño de Actividades	Plataforma	Ajustes MM
			Conversion iSpring MM
		Insumos	Subir Google Drive recursos convertidos
Montaje en el Aula			
Estandarización		Solic. Consignas e Insumos (recursos)	
		Recepción de Consignas	
Plataforma		Aplicar formato	
		Tecnología de texto	
Fase III	Validar Curso	Plataforma	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica
		Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado
	Liberar Curso	Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda

ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

En el trimestre académico septiembre-diciembre 2012, se cumplió con la Fase I del proceso para la virtualización de las asignaturas del primer año de la Carrera de Organización Empresarial. Sin embargo, las asignaturas Inglés I, Inglés III y Fundamentos de Derecho no lograron culminar la Fase I.

Continuando con el cronograma, en enero 2013 se inicio la Fase II, la cual se planifico culminar en conjunto con la Fase III en el mes de julio 2013. Para el mes de julio sólo se alcanzo un 26,67% de la meta de virtualización de las asignaturas.

Aunque al cierre del mes de diciembre de 2013, se progreso en la virtualización, no se logro culminar otra asignatura. En el Cuadro N. 2 se observa el nivel porcentual de avance por asignaturas discriminado por trimestre académico.

Cuadro 2: Distribución de asignaturas en relación a su nivel de avance porcentual de Virtualización al 16/12/2013

<i>Trimestre Académico</i>	<i>Total Asignaturas</i>	<i>Asignaturas</i>			
		<i>Virtualizadas</i>	<i>Fase II avance >= 85%</i>	<i>Fase II avance <=84%</i>	<i>Asignaturas en Fase I</i>
Total	15	2	2	6	5
I	4	2	1	0	1
II	5	0	0	4	1
III	6	0	1	2	3

Considerando estos indicadores reportados, se sugirió al Decanato de Estudios Tecnológicos un plan de acción para el año 2014 que permita garantizar la culminación efectiva del proceso de virtualización de las asignaturas del primero y segundo año. Para ello se establecieron grupos de atención conforme al rendimiento alcanzado al cierre del año 2013. En el Cuadro N. 3 se plantea el seguimiento a las asignaturas rezagadas del primer año de la carrera.

Cuadro 3: Plan de Acción fijado para el año 2014. Asignaturas del primer año

<i>Acción</i>	<i>Meta</i>	<i>Pendiente</i>	<i>Asignatura</i>	<i>Seguimiento al 31/01/2014</i>
Supervisión directa del Departamento Académico	28/02/2014	Fase I	Ingles I	Pendiente
			Ingles II	Pendiente
			Ingles III	Pendiente
	30/03/2014	Fase II	Fundamentos de Derecho	Pendiente
			Introducción a la Computación	Pendiente
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/01/2014	Guiones de Audio (*)	Hombre, Cultura y Sociedad II	Recibido. En proceso grabación de audios
			Fundamentos de Administración I	Pendiente
			Fundamentos de Economía	Pendiente
Acompañamiento del Departamento Académico	28/02/2014	Estructuración del curso	Estadística I	Pendiente
Seguimiento al profesor sobre actividades pendientes	31/12/2013	Actividades por entregar	Fundamentos de Administración II	Pendiente
Incrementar ritmo de producción de recursos	15/02/2014	Aumentar el porcentaje de avance	Matemática I	Pendiente
			Lenguaje II	En proceso
			Matemática II	En proceso


(*) Se ha detectado algún grado dificultad para la elaboración de los guiones de audio por parte de los expertos en contenido. Se está evaluando la situación para encontrar alternativas

Legenda:

I Trimestre
 II Trimestre
 III Trimestre

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 31/01/2014 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fase I y Fases II y III), la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial y el desarrollo del Bloque Introductorio que se inicio en el mes de Octubre 2013. En cuanto a la plataforma Moodle, se establecieron nuevos requerimientos, acordados por la Comisión de Virtualización Adhoc con lo cual, para el año 2014 se planteo como meta trabajar con Autenticación de ingreso a la Plataforma (Módulo CAS), con Matriculación (Formato csv), la Migración a Moodle 2.6 y continuar con el soporte a los equipos de Diseño Instruccional y Especialistas en Tecnología Instruccional.


Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 31/01/2014 – Fases I*, II y III.

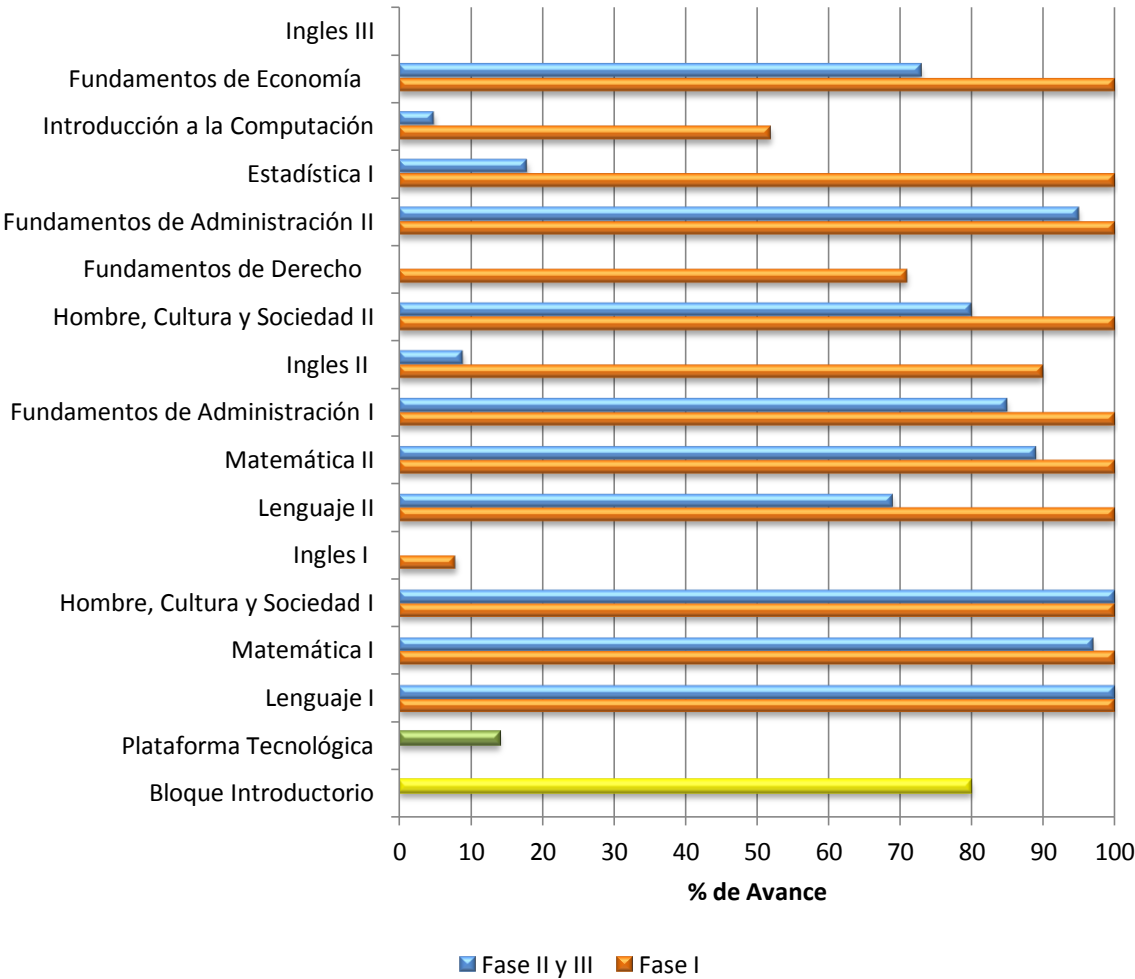

Leyenda:
■ Fase II y III ■ Fase I ■ Plataforma Tecnológica ■ Bloque Introductorio
 *Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive

En el Gráfico 2 se representa la reestimación realizada por la DSM para cada asignatura del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial y su nivel de avance al 31/01/2014.

Gráfico 2: Meta reprogramada para Enero – Marzo 2014 (Fase II y III)

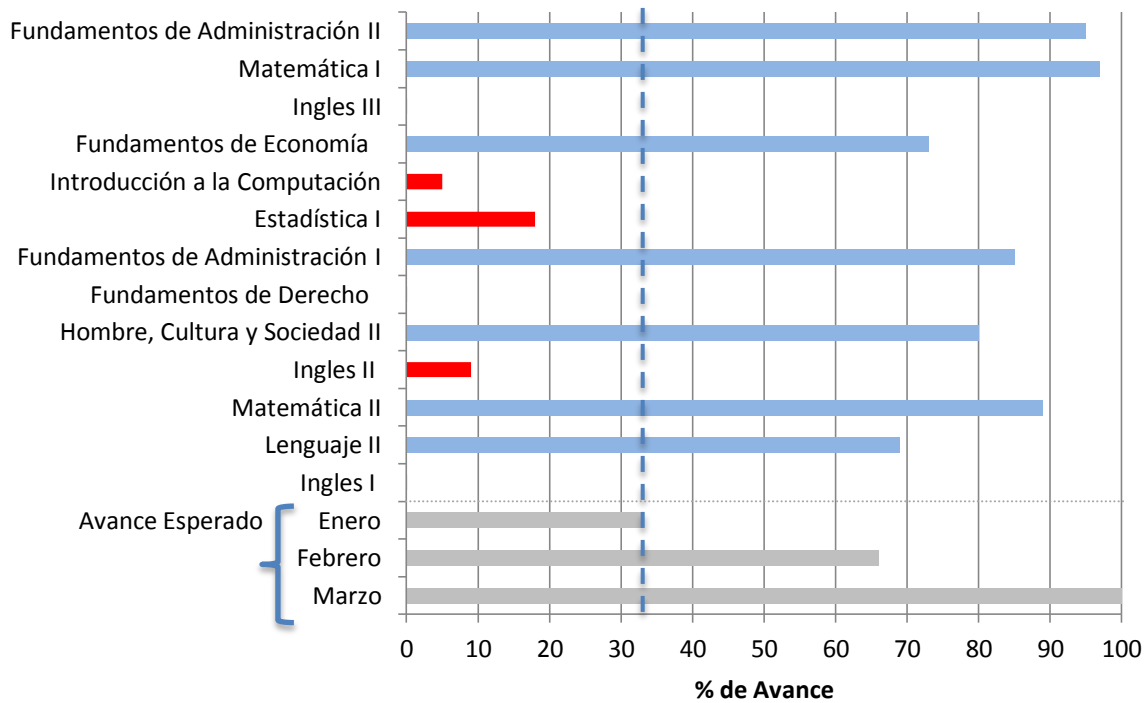

Leyenda:
■ Sobre lo esperado ■ En lo esperado ■ Muy por debajo de lo esperado ■ Estimado

Los cursos de *Matemática I* y *Fundamentos de Administración II* debieron estar listos para el mes de julio 2013, sin embargo, aún se presentan como inconclusos

Matemática I: No hubo avance. Se mantiene en proceso la sincronización de recursos no presenciales.

Matemática II: No hubo avance. Está en proceso la sincronización de recursos no presenciales.

Hombre, Cultura y Sociedad II: Está en proceso la grabación de los audios de las presentaciones no presenciales.

Lenguaje II: Se encuentra en producción de contenidos. En espera por las actividades de parte del profesor.

Fundamentos de Administración I: Se mantiene igual. A espera de la recepción del material por parte del experto en contenidos.

Fundamentos de Economía: Se mantiene igual. A espera de la recepción del material por parte del experto en contenidos.

Fundamentos de Derecho: Se mantiene el mismo porcentaje. No se ha logrado completar la Fase I, con lo cual el inicio de la Fase II se encuentra demorado. A espera de la recepción del material por parte del experto en contenidos.

Inglés I: No se ha culminado la Fase I.

Inglés II: No hubo avance en la virtualización.

Inglés III: No existe ningún recurso y plantillas a revisar hasta esta fecha.

Introducción a la Computación: No hubo avance por parte del experto en contenido. Aún no he recibido las plantillas con los ajustes ni los recursos solicitados.

Estadística I: Aún el experto en contenidos está haciendo ajustes del material.

Para el mes de enero la situación de las asignaturas Inglés I, II y III, así como Introducción a la Computación y Fundamentos de Derecho se mantienen sin avances. En el caso de Estadística I, no se ha logrado avanzar al ritmo esperado.

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Para el mes de enero 2014 se procedió a designar los Especialistas que acompañaran a los expertos en contenido en el proceso de virtualización. Seguidamente, cada especialista inicio el trabajo de contactar a cada profesor para facilitarle los mecanismos de comunicación disponibles en este proceso de acompañamiento. En el Cuadro N. 4 se detalla el plan de acción para las asignaturas del segundo año.

Cuadro 4: Plan de Acción fijado para el año 2014. Asignaturas del segundo año

<i>Acción</i>	<i>Meta</i>	<i>Asignatura</i>	<i>Seguimiento al 31/01/2014</i>
Designar asesor especialista a cada asignatura	Arrancar a partir del 10/02/2014	Métodos y Tiempos	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 30/01/2014
		Sistemas y Procedimientos	Listo. Pendiente contacto con profesor.
		Legislación Laboral	(Primer contacto entre especialista y profesor el 04/02/2014)
		Contabilidad I	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 16/01/2014
		Estadística II	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Comunicación Gerencial	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 16/01/2014
		Calidad Total	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Administración de Recursos Humanos	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Contabilidad II	Listo. Pendiente contacto con profesor.
		Estudios Generales I	(Primer contacto entre especialista y profesor el 05/02/2014)
		Administración de la Producción	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Técnica de Control de Calidad	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Supervisión de Recursos Humanos	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 31/01/2014
		Sistemas de Información I	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 16/01/2014
		Estudios Generales II	Listo. Primer contacto entre especialista y profesor el 16/01/2014
Requerir acompañamiento del Departamento Académico en los casos que no han iniciado Fase I	A partir del 10/02/2014	Métodos y Tiempos	
		Sistemas y Procedimientos	
		Legislación Laboral	
		Contabilidad I	
		Comunicación Gerencial	
		Contabilidad II	
		Administración de la Producción	

Legenda:

 IV Trimestre


 V Trimestre

 VI Trimestre

En algunos casos, ya se inicio el proceso de revisión del material disponible en las carpetas compartidas en el Google Drive para iniciar el trabajo de asesoría, conforme al nivel de avance que alcanzo cada profesor con la Fase I (Véase Gráfico N. 3).

Es importante destacar, que las Plantillas disponibles en el Google Drive están diseñadas de tal forma, que el profesor puede completar cada una sin mayor complicación. Sin embargo, un aspecto que resulta necesario reforzar es la ilación entre plantillas lo cual permitirá el exitoso diseño del ambiente semipresencial en el espacio de la Plataforma Moodle que se está desarrollando. Es en esta etapa, donde los especialistas destacan las mayores advertencias para darle continuidad a la Fase II y III.

Gráfico 3: Plantillas*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Segundo año de Org. Emp. al 31/01/2014 (Fase I)**

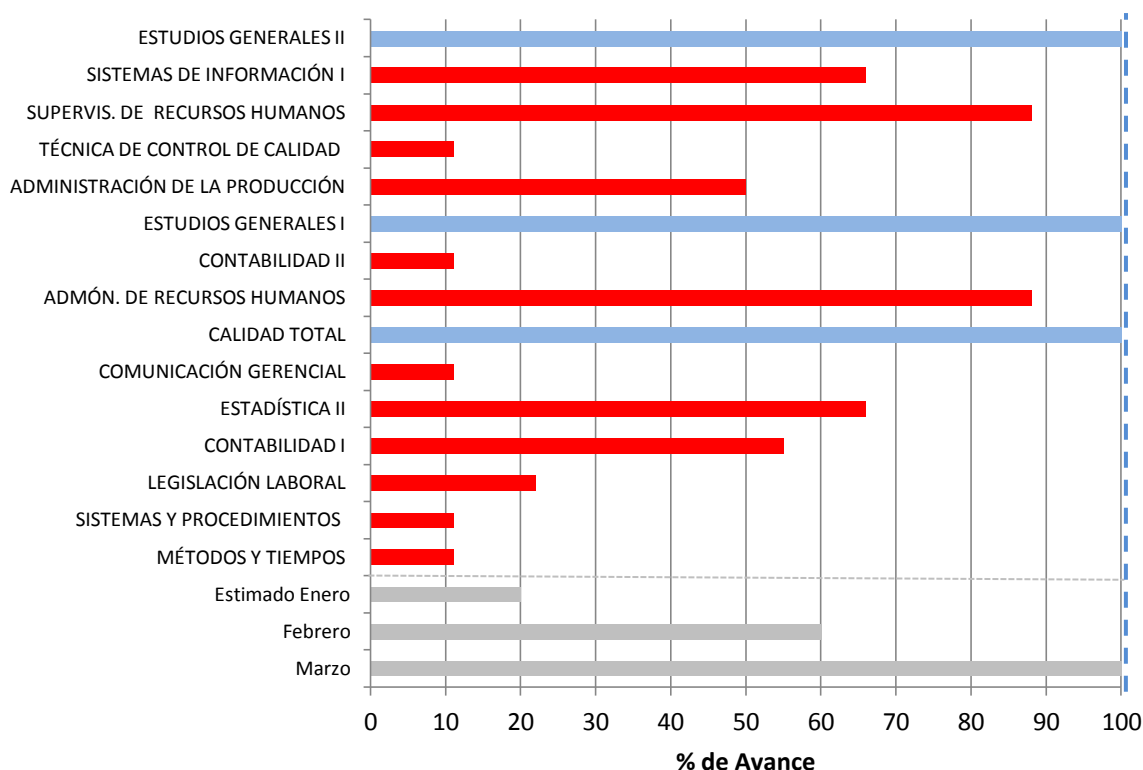

Leyenda:

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

(*)

- Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL
- Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO
- Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO
- Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO
- Plantilla N° 7 GLOSARIO
- Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA
- Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA


**El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive.

ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de mayo 2013 inicio el proceso para la virtualización de las asignaturas del tercer año de la carrera de Organización Empresarial (6 cursos regulares, 4 Electivas Profesionales y 1 Pasantía), dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por éstos.

En el Gráfico 4 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables. Es importante señalar, que se debió realizar la reestimación de los tiempos para dar cumplimiento a la Fase I de las asignaturas del tercer año, visto el bajo nivel de avance alcanzado hasta diciembre de 2013.

Gráfico 4: Plantillas*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Tercer año de Org. Emp. al 31/01/2014 (Fase I)**

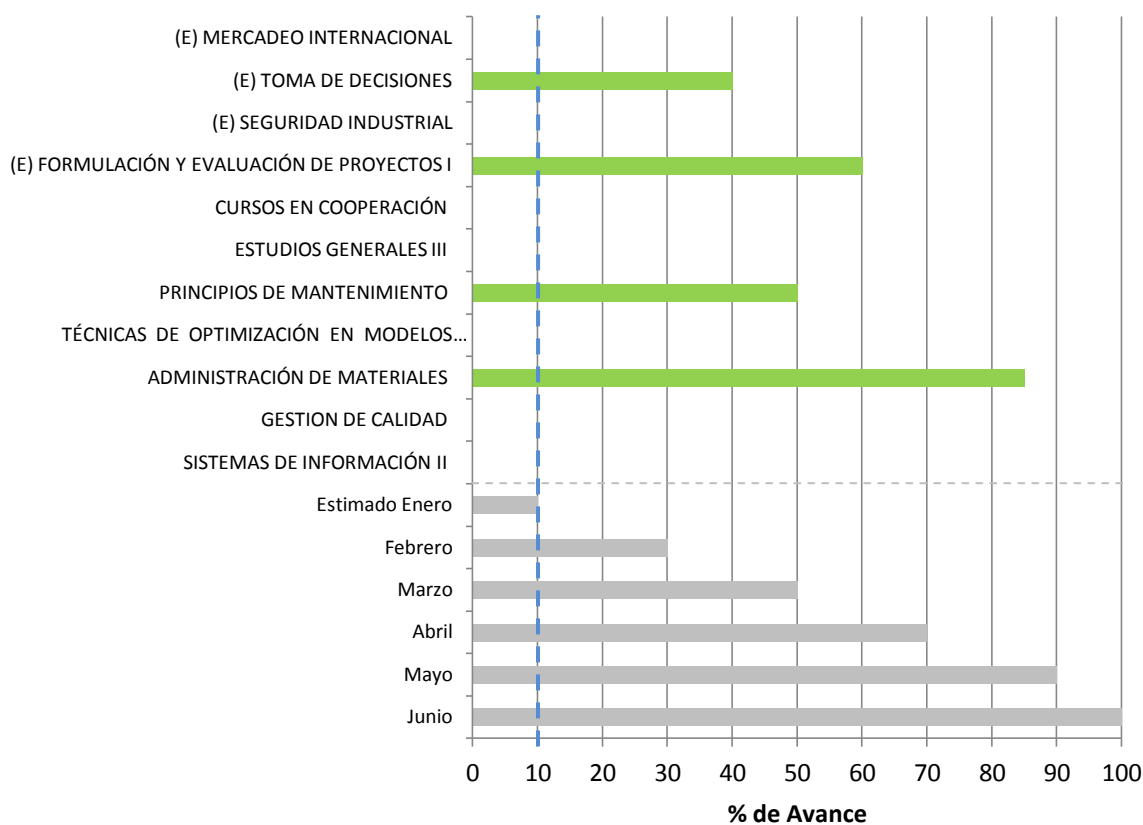

Legenda:

■ Sobre lo esperado
 ■ En lo esperado
 ■ Por debajo de lo esperado
 ■ Estimado

(*)

Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO

Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO

Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO

Plantilla N° 7 GLOSARIO

Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA

Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

Plantilla N° 10 EVALUACIÓN

**El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive
