



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**

SECRETARÍA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

**INFORME DE AVANCE**  
**VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS**  
**DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**  
**(Modalidad Semi-presencial)**  
**AL 30/11/2014**

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

**Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos**


Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores
			Entrega de Plantillas
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores
			Certificación de los Programas Académicos en Decanatos
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas
			Recepción de Plantillas
			Validación de plantillas vs recursos faltantes
		Revisión inicial (preliminar)	
Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos
			Recepción
			Revisión/Ajustes
		Diseño de contenidos	Aplicar formato
			Tecnología de texto
			Solicitud imágenes DG
			Elaboración G.Audio
			Elaboración G.Anim.
			Entr. insumos Dpto.MM
		Producción MM	Subir fuentes Google Drive
			Revisión DI
			Ajustes MM
	Conversión iSpring MM		
			Subir Google Drive recursos convertidos
		Plataforma	Montaje en el Aula
	Diseño de Actividades	Insumos	Solic. Consignas e Insumos (recursos)
			Recepción de Consignas
Estandarización		Aplicar formato	
		Tecnología de texto	
Plataforma		Montaje en aula	
		Revisión/Ajustes	
Fase III	Validar Curso	Plataforma	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica
		Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado
	Liberar Curso	Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda

## ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

Para septiembre de 2012 se dio inicio a la virtualización de las quince asignaturas del primer año de la carrera.

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 31/10/2014 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fase I y Fases II y III), la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial y el desarrollo del Bloque Introductorio. En comparación al mes anterior, se registro avances en las asignaturas Matemática I, Matemática II, Lenguaje II y Estadística I.

**Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 30/11/2014 – Fases I\*, II y III.**

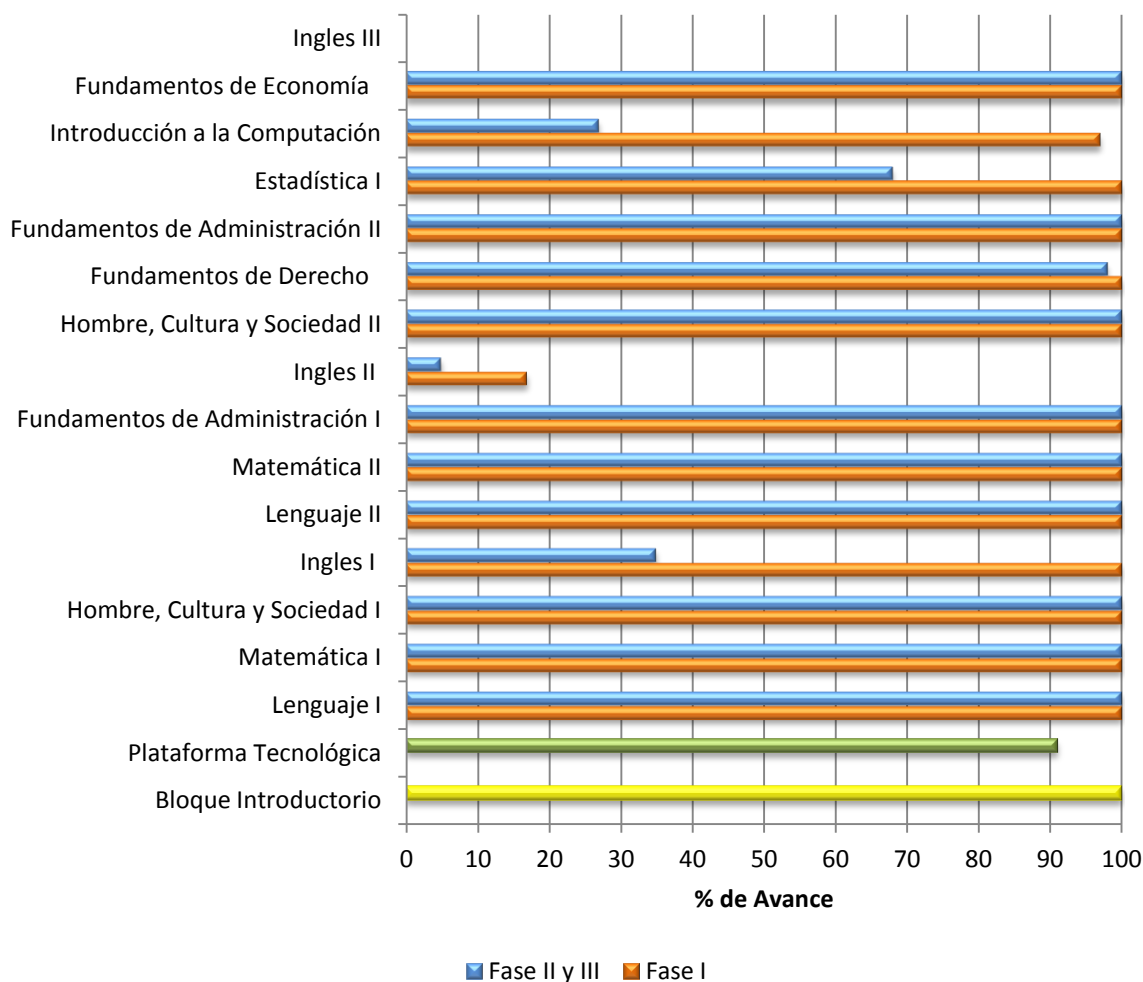

**Leyenda:**


■ Fase II y III   
 ■ Fase I   
 ■ Plataforma Tecnológica   
 ■ Bloque Introductorio

\*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive, ajustado a los requerimientos de los Especialistas

En diciembre de 2013 se fijo unas estrategias para atender las asignaturas rezagadas del primer año, conforme a las dificultades que se habían presentado en el transcurso del año. Sin embargo, al llegar al 30/11/2014 se mantienen rezagadas Inglés I, Inglés II e Introducción a la Computación.

En el Gráfico 2 se representa la reestimación realizada por la DSM para cada asignatura del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial y su nivel de avance al 30/11/2014.

**Gráfico 2: Meta reprogramada para Enero – Marzo 2014 (Fase II y III) evaluada al 30/11/2014**

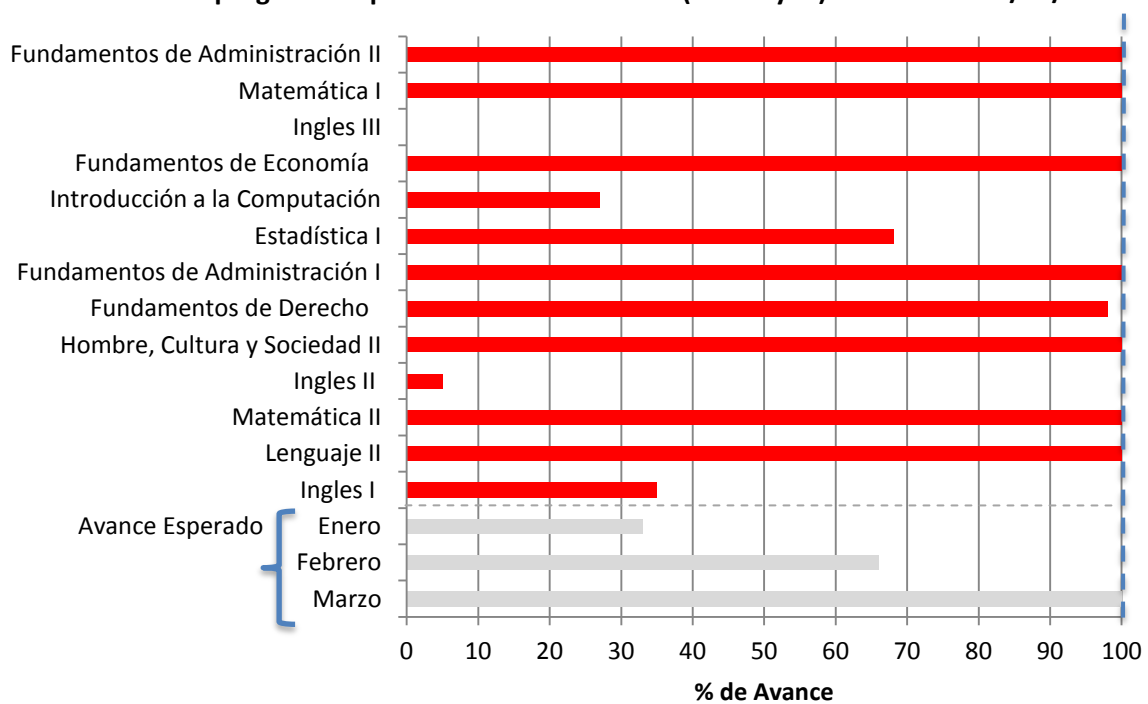

**Leyenda:**  
 Sobre lo esperado     
 En lo esperado     
 Muy por debajo de lo esperado     
 Estimado

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

*Estadística I:* Se avanzó en el desarrollo de los guiones de los temas enviados por el experto en contenido.

*Fundamentos de Administración I:* Se concluyó la Virtualización.

*Fundamentos de Administración II:* Se concluyó la Virtualización.

*Fundamentos de Derecho:* Queda únicamente la subida al aula de un recurso para clase no presencial que está en producción y la revisión final del curso.

*Fundamentos de Economía:* Se concluyó la Virtualización.

*Hombre, Cultura y Sociedad II:* Se concluyó la Virtualización.

*Inglés I:* El porcentaje se corresponde a la revisión, conversión y subida al aula de nuevos recursos entregados por la experta en contenido.

*Inglés II:* Se recibieron los recursos de los temas 1 y 2 (Unidad 1) y fueron enviados a producción.

*Inglés III:* No hubo avance. El experto en contenido está trabajando con Inglés I.

*Introducción a la Computación:* Se enviaron a producción las presentaciones de la Unidad1, tema 1. El especialista sigue a la espera por los ajustes (nuevos y viejos) y el resto de recursos. Sin respuesta a los últimos correos enviados.

*Lenguaje II:* Se concluyó la Virtualización.

*Matemática I:* Se concluyó la Virtualización.

*Matemática II:* Se concluyó la Virtualización.


## **ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO**

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Para el mes de enero 2014 se procedió a designar los Especialistas que acompañaran a los expertos en contenido en el proceso de virtualización. Seguidamente, cada especialista inicio el trabajo de contactar a cada profesor para facilitarle los mecanismos de comunicación disponibles en este proceso de acompañamiento. Luego del proceso de revisión del material disponible en las carpetas compartidas en el Google Drive cada Especialista envió las recomendaciones para poder culminar con la Fase I.

En el Gráfico N. 3 se muestra el nivel de avance de cada asignatura del segundo año de la carrera. Con respecto al reporte del mes anterior, solo se registró avances en la asignatura Estudios Generales II.

**Gráfico 3: Avance General de la Virtualización del Segundo Año Org. Empresarial al 30/11/2014 – Fases I\*, II y III.**

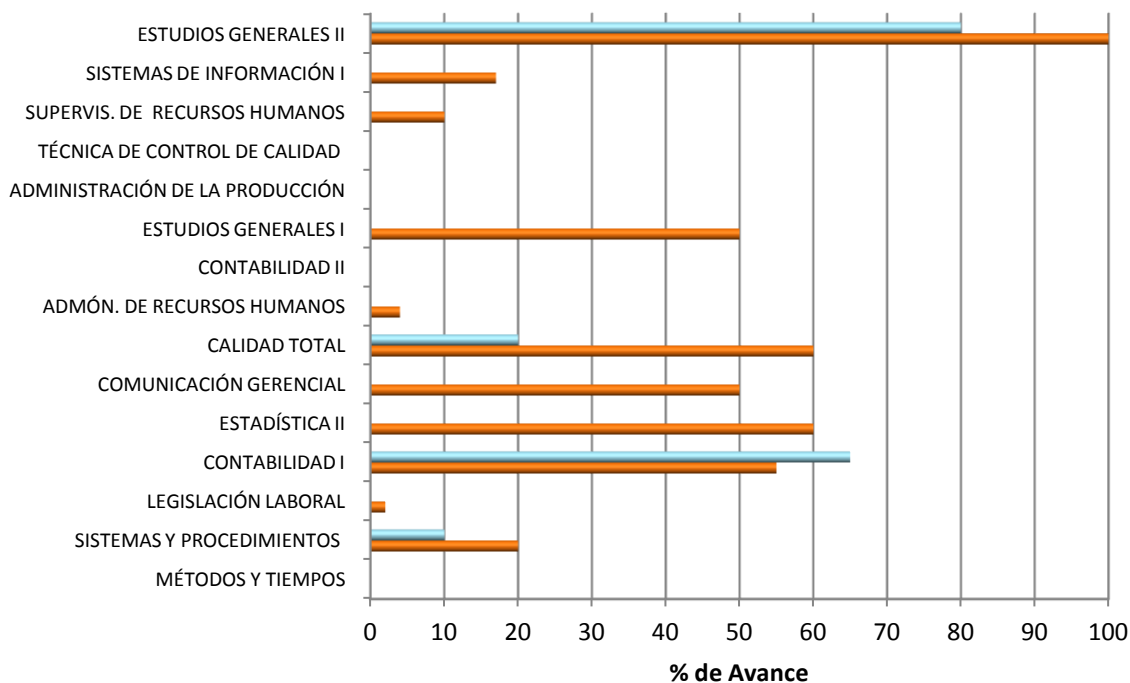


**Leyenda:**



\*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive luego de la revisión del Especialista.

En el Gráfico 4 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

**Gráfico 4: Seguimiento al Avance alcanzado al 30/11/2014 en comparación al esperado por la DSM en la Virtualización del Segundo Año de la Carrera de Organización Empresarial. Meta Abril 2014 (Fase I\*)**

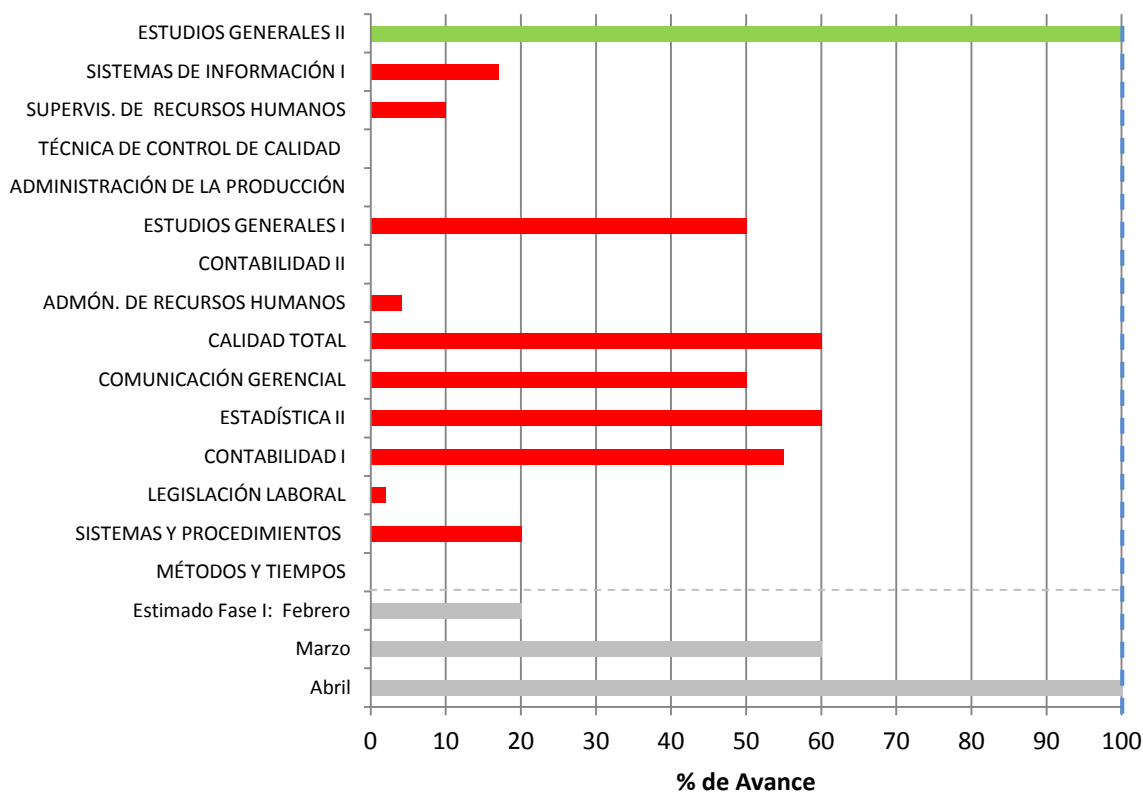

**Leyenda:**

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

\* Para cumplir con el 100% de la Fase I el experto en contenido debe atender y responder a las recomendaciones dadas por el Especialista en cuanto a la relación entre las Plantillas y Recursos propuestos, conforme al Programa Académico certificado.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

*Administración de la Producción:* No hubo avance. No se ha recibido comunicación alguna por parte del experto en contenido.

*Administración de Recursos Humanos:* No hubo avance. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

*Calidad Total:* Desarrollo de los contenidos entregados por parte del experto en contenido.

*Comunicación Gerencial:* No hubo avance. No se ha tenido respuesta relativa a posible nuevo experto responsable para colaborar en la virtualización del curso.

*Contabilidad I:* No hubo avance. El especialista debe terminar el ajuste de los guiones de audio de las presentaciones no presenciales. Pendiente el planteamiento de actividades/ejercicios y el ajuste/actualización de plantillas de parte del experto en contenido.

*Contabilidad II:* No hubo avances por parte del experto en contenido.

*Estadística II:* No hubo avances. En espera del Programa Académico definitivo para avanzar.

*Estudios Generales I:* No hubo avance por parte de la especialista. La experta en contenido se encuentra a la espera de nuevas instrucciones.

*Estudios Generales II:* Montadas todas las actividades del curso en la plataforma. En producción los recursos.

*Legislación Laboral:* No hubo avance. El experto en contenido quedó en revisar las plantillas devueltas y enviarlas nuevamente.

*Métodos y tiempos:* No hubo avances. No se ha comenzado con el llenado de las plantillas correspondiente a la fase I.

*Sistemas de Información I:* No hubo avance. La especialista sigue a la espera de las plantillas. Sin respuesta a los últimos correos enviados.

*Sistemas y procedimientos:* Solicitud y revisión de guiones de audio en su primera etapa.

*Supervisión de Recursos Humanos:* No hubo avance.

*Técnica de Control de Calidad:* No hay ningún avance. A pesar de que la experta en contenido está trabajando en el llenado de las plantillas, no se ha recibido nada aún. Se esperaba recibir por parte de la experta el llenado de las plantillas 3 y 6 para final de noviembre; no se obtuvo respuesta.




## ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de mayo 2013 inicio el proceso para la virtualización de las asignaturas del tercer año de la carrera de Organización Empresarial (6 cursos regulares, 4 Electivas Profesionales y 1 Pasantía), dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por éstos.

En el Gráfico 5 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables al 30/11/2014. No hubo avances en el mes de noviembre.

**Gráfico 5: Plantillas\*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Tercer año de Org. Emp. al 30/11/2014 (Fase I\*\*)**

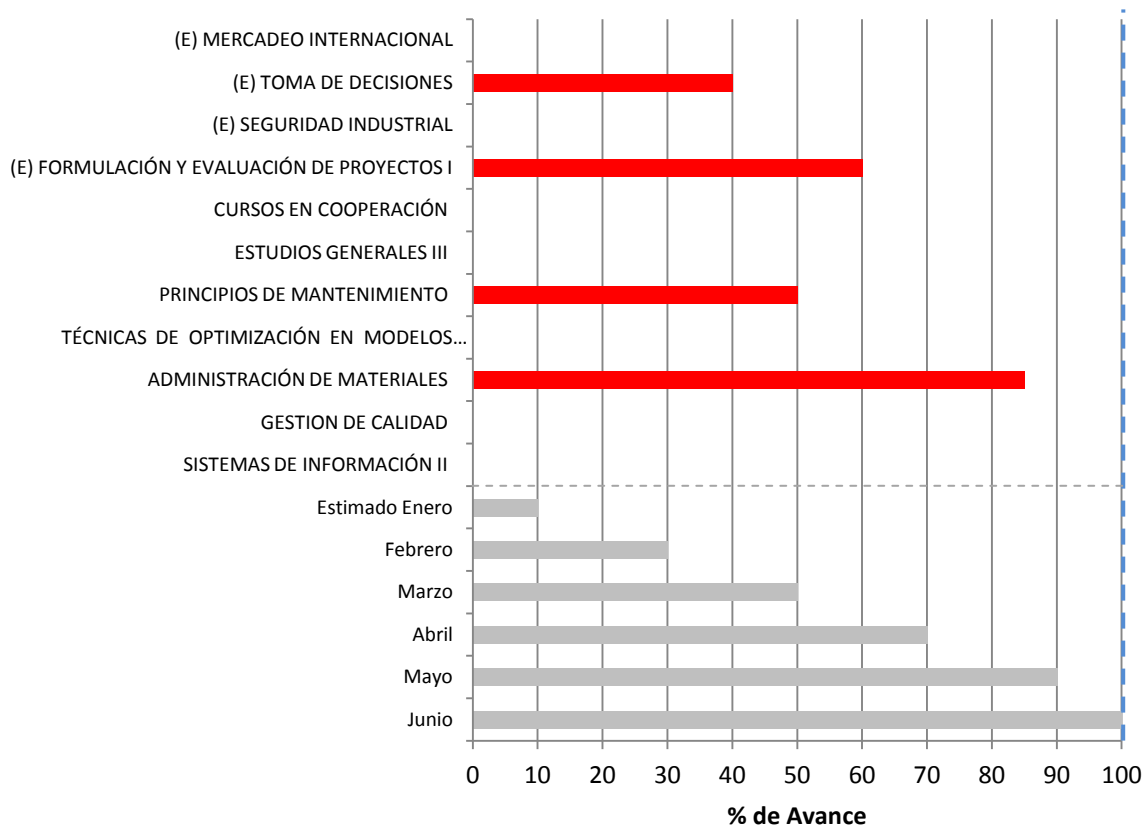

### Leyenda:

■ Sobre lo esperado     
 ■ En lo esperado     
 ■ Por debajo de lo esperado     
 ■ Estimado

(\*)

Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO

Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO

Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO

Plantilla N° 7 GLOSARIO

Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA

Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

Plantilla N° 10 EVALUACIÓN

\*\*El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive
